

Raport privind progresul implementarii granturilor finantate de Fondul Global - R6


Intrunirea CNC-FG din
2 Noiembrie 2009



GRANTUL TUBERCULOZA

RAPORT PROGRAMATIC

Grant TB Faza a 2-a Runda a 6-a

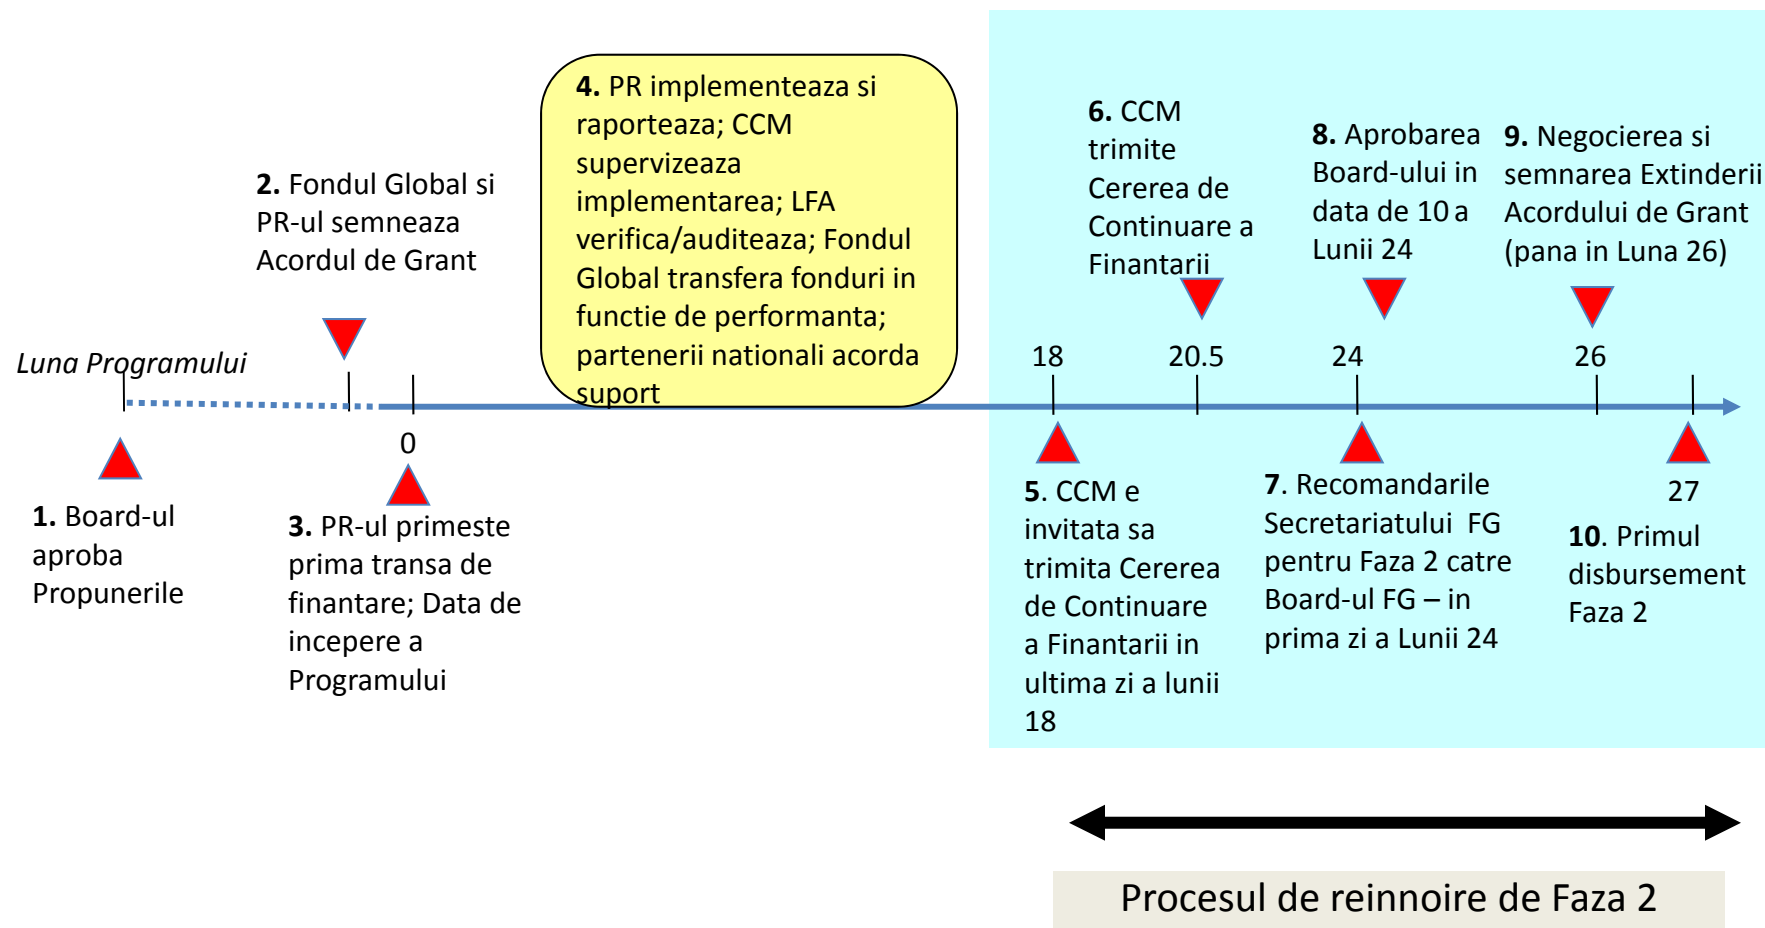

Aplicatia pentru Faza 2 a servit ca punct de verificare d.p.d.v. al finantarii bazate pe performanta

Etapele 5-6

Activitate	Deadline/ Perioada	Resp.	Detalii
Analiza implementarii Q1 - Q6	27 aprilie – 29 aprilie	RAA	Analiza rating implementare (indicatori) & rata cheltuire / proiect / implementator:
Comunicare scrisa transmisa fiecarui SR re. rating & Solicitare pregatire documente anul 3	30 aprilie - 15 mai 27 mai	RAA SRs	Comunicare buget anul 3; Furnizare Template documente: descriere activitate; plan de lucru; plan achizitii; buget detaliat. Solicitare completare documente faza 2
Solicitare informatii pentru aplicatie de la organizatii si institutii	15 – 31 mai	RAA	Solicitare informatii pentru aplicatie – Cap. C (PNCT), Cap. D. (Finantarea din surse nationale – MS, CNAS, OMS)
Primire, analiza si agregare date pentru anexele aplicatiei	27 mai – 8 iunie	RAA	
Realizarea si transmiterea la FG si LFA a Draft Performance Framework Years 3-4 + EFR (raportul financiar)	1 Iunie	RAA	Conform planificarii incluse in invitatia FG transmisa CCM la 1 aprilie
Transmiterea catre LFA a Raportului privind progresul implementarii - incl. ultimele rezultate aferente trimestrului 6	15 mai	RAA	Conform planificarii incluse in invitatia FG transmisa CCM in 22 dec.
Realizarea draftului aplicatiei (inclusiv anexele)	28 mai – 8 iunie	RAA	Realizarea aplicatiei pentru faza a 2-a
Circulare draft no. 1 al aplicatiei in cadrul CCM; integrare modificari, etc.	9 – 10 iunie	CCM	Prin e-mail
Aprobarea variantei finale a cererii pentru continuarea finantarii	12 Iunie (vineri)	CCM,	Prin vot electronic
Transmiterea cererii la FG	15 Iunie (luni)	RAA	Prin e-mail

Etapa 7-9

- Multiple etape de revizuire de catre Fondul Global referitor la:
 - Indicatori (modificari denumiri, tinte si distributia lor pe semestre/trimestre)
 - Medicamente de linia a 2-a pentru pacientii cu MDR TB
 - Ancheta de chimiorezistenta
 - Bugete
- In data de **23.09.2009**, Maria Kirova-Global Fund Portofolio Manager a trimis catre CCM, decizia Boardului FG de continuare a fazei a 2-a (**GO**) si Grant Score Card (Grantul TB pentru primele 3 semestre de implementare a primit **scorul A**)

Etapa 7-9

- In data de **16.10.2009**-au fost trimise solicitarile catre sub-recipienti, pentru completarea anexelor pentru faza a 2-a (deadline 23 octombrie 2009)
- In data de **21.10.2009**, PR-ul semneaza cu FG acordul privind extinderea acordului de finantare pentru faza 2 a programului.

Rezultate

- Continuarea fazei a 2-a pentru urmatorii 3 ani
- Bugetul fazei a 2-a este in valoare de **3,949,733 EURO**:
 - S-au operat ajustari de catre FG in valoare totala de 105,000 Euro, din bugetul propunerii trimise de CCM
 - FG a aprobat spre a fi transferati 3.555.623 euro cash, diferenta (394.110 euro) urmand a fi acoperita din economiile Fazei I si TVA-ul recuperat.

Rezultate

- Pana la 30 Oct. 2009 au fost semnate acte le aditionale cu **5 sub-recipienti** (UIP TB Marius Nasta, CRR, CPSS, SC si CNSMF), urmand ca in saptamana **2-7 Nov. 2009** sa fie semnat si ultimul act aditional (UIP TB ANP).

GRANTUL TB – INDICATORI (FAZA I):

Grantul TB-Subrecipienti si proiecte

- 7 subrecipienti:
 - CPSS-6 proiecte
 - Salvati copiii-3 proiecte
 - UIP TB ANP-2 proiecte
 - SNSPMS-2 proiecte
 - UIP TB Marius Nasta-1 proiect
 - CNSMF-1 proiect
 - CRR-1 proiect


Grantul TB-Indicatori cheie

ORGANIZATIE	INDICATOR	REZULTAT PRECONIZAT Q8	REZULTAT ATINS Q8	PROCENT
SC	Numarul persoanelor instruite pentru asigurarea educatiei pentru sanatate in domeniul TB, trimiterea catre servicii medicale a persoanelor fara adapost	165	333	201.8
CPSS+SC	Numarul de persoane din comunitatile vulnerabile care au participat la activitati de educatie pentru sanatate in domeniul TB prin activitati la nivel comunitar.	9600	17794	185.4
CPSS	Numarul de persoane din reseaua de pneumoftiziologie instruita in management de program, supraveghere epidemiologica si managmenet financiar	450	793	176.2
SC	Numarul de suspecti de TB identificati si referiti catre servicii medicale intre persoanele fara adapost	360	588	163.3
SC	Numarul cazurilor de TB cu microscopie pozitiva depistate in randul persoanelor fara adapost	110	150	136.4
CNSMF	Numarul de persoane instruite pentru testarea fezabilitatii si implementarii strategiei PAL (Abordul practic al sanatatii pulmonare).	80	104	130.0
CRR	Numarul pacientilor cu TB care au primit suport pentru alimente	1500	1942	129.5
CPSS+SNSMPS	Numarul de persoane cu rol de decizie si jurnalisti sensibilizati in cadrul unor activitati de advocacy, comunicare si mobilizare sociala (ACSM).	260	332	127.7

Grantul TB-Indicatori cheie

ORGANIZATIE	INDICATOR	REZULTAT PRECONIZAT Q8	REZULTAT ATINS Q8	PROCENT
CPSS	Numarul de medici de familie si furnizori privati de servicii medicale instruiti in strategia DOTS	1000	1156	115.6
ANP	Numarul de persoane din sistemul penitenciar instruite in prevenirea TB si educatia pentru sanatate in domeniul TB, activitati de control al TB	1321	1313	99.4
Nasta	Numarul de bolnavi MDR- TB inrolati in tratament	160	145	90.6
ANP	Numarul de detinuti care au beneficiat de educatie pentru sanatate in domeniul TB	15840	13008	82.1

INDICATORI CHEIE TB-FAZA 1

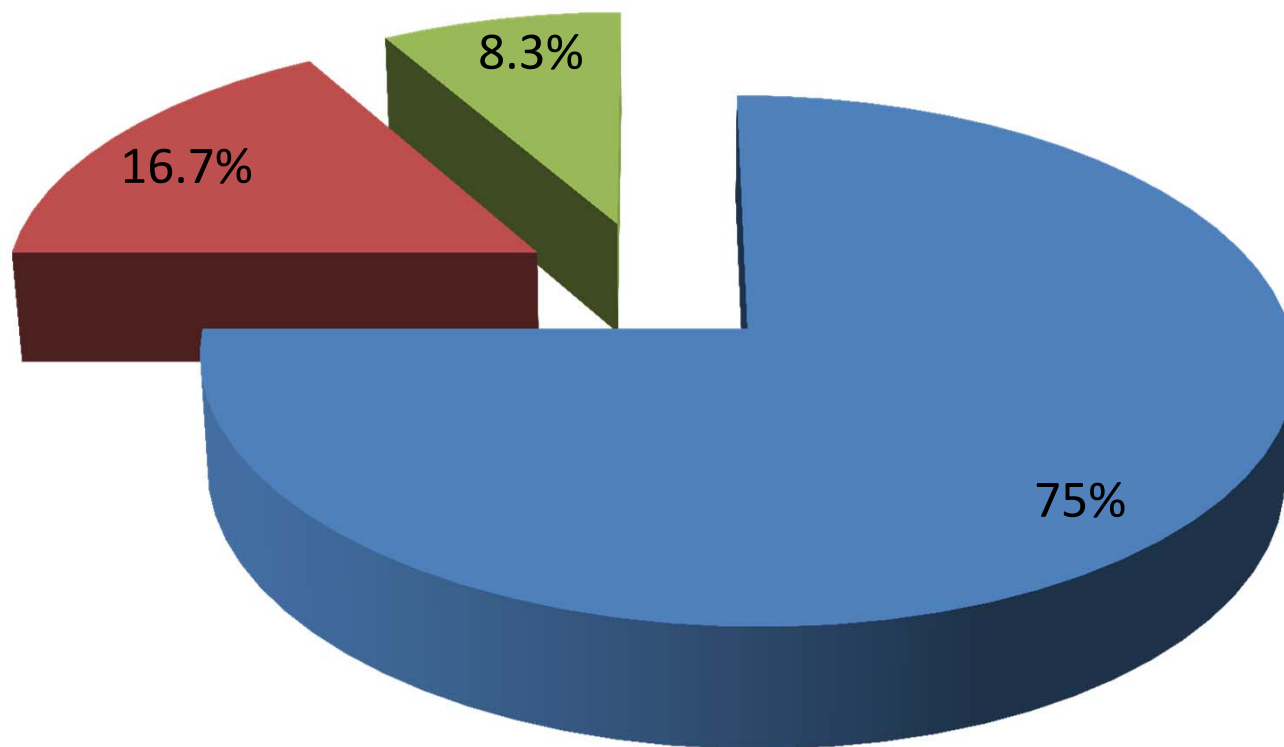

■ peste 100% ■ intre 90-100 ■ peste 80%

GRANTUL TB – PROGRES GENERAL

CPSS

- **1.156 Medici de Familie instruiti** (fata de 1.000 planificati pana la finalul fazei I)
- **16.525 persoane** din grupuri vulnerabile atinse cu activitati IEC, fata de 8.600 planificate pana la finalul fazei I.
- **793 specialisti din retea de pneumoftiziologie instruiti**, fata de 450 planificati pana la finalul fazei I

CPSS

- Au fost instruite 44 persoane in metodologia cercetarii, abilitati pentru scrierea unor propuneri de finantare, etica cercetarii, biostatistica fata de 30 planificate.
- Au fost finalizate 6 proiecte de cercetare operationala in domeniul controlului TB (fata de 3 planificate. Rezultatele au fost prezentate in cadrul unei conferinte de diseminare a rezultatelor (2 Oct. 2009).

Crucea Rosie

- Revizuirea metodologiei de distribuire a stimulentei
- Instruirea a 24 de voluntari si a 9 cadre medicale din retea TB
- Organizarea activitatii de distribuire a stimulentei: 2 conferinte de presa si 500 de afise tiparite
- **1.942 bolnavi TB** din judetele Iasi si Prahova au primit stimulente
- Distribuirea unui numar de 37.250 de tichete sociale catre pacientii cu TB

Salvati Copiii

- Numar de suspecti TB, identificati si referiti catre sistemul medical, din randul copiilor/tinerilor strazii si parintii lor: **588 versus 360 planificati**
- Numar de persoane diagnosticate cu TB (microscopie pozitiva sau negativa) din randul copiilor si tinerilor strazii si parintii lor: **150 versus 110 planificati**
- Numar de persoane diagnosticate cu TB cu tratamentul finalizat: **58 din 95 planificati**

Salvati copii

- Numar de suspecti si bolnavi de TB beneficiari de servicii de asistenta sociala: **582 versus 360**
- Numar de persoane diagnosticate cu TB care beneficiaza de consiliere psihologica: **123 versus 150**
- Numar de copii/tineri ai strazii informati si educati despre TB: **1.269 versus 1.000**
- Numar de profesioniști din domeniul social si medical instruit sa lucreze cu persoanele fara adapost si in ceea ce priveste TB: **333 versus 165**

UIP TB - ANP

- Nr. deținuți atinși prin sesiunile de educație:
13.008 versus 15.840 planificati (82%)
- **Platforma de e-learning functionala, primul modul de e-learning livrat**
- Pana la 30 octombrie fusesera definitivate inca 2 module, urmand ca pana la 15 noiembrie sa fie finalizat si ultimul modul.
- Materiale de infomare, educare, comunicare pentru educatorii pentru sanatate, detinuti, etc (agende, diplome, caiete, pixuri, etc)

UIP TB ANP

- Numar educatori pentru sanatate instruiti: **381 versus 396 planificati**
- Nr. personal nemedical, mai ales supraveghetori, instruiți în CI TB: **887 versus 880 planificati**
- Nr. medici din penitenciare/rețea PNCT participanti **45 - indicator atins**
- 1 conferinta pentru diseminarea rezultatelor programelor de control al TB in penitenciare – 24 Sept. 2009 (organizata in parteneriat cu RAA)

UIP TB Marius Nasta

- Au fost introdusi in cea de a 3-a cohorta a proiectului DOTS-Plus **145 bolnavi MDR-TB**, fata de 160 planificati pana la sfarsitul semestrului 4
- A doua transa de medicamente a sosit in tara in august 2009 (achizitie RAA) si a fost asigurata **aprovizionarea neintrerupta** cu medicamente de linia a 2-a a bolnavilor cu MDR-TB inclusi in proiectul DOTS-Plus.
- A fost finalizat protocolul pentru Ancheta de Supraveghere a Chimiorezistentei Tuberculozei la substantele antituberculoase de linia a 2-a.
 - A fost definitivat personalul anchetei (s-au stabilit pozitiile si fisele de post, au fost incheiate contractele, etc.)
 - A fost definitivat contractul pentru achizitia mediilor de cultura
 - Ancheta va incepe la data de 1 octombrie 2009, urmand sa se finalizeze pana la 30 septembrie 2010

CNSMF

- 2 judete pilot in care se implementeaza strategia PAL
- Nr medici de familie formati in implementarea strategiei PAL: **104 versus 80 planificati**
- Numar de cabinete medicale dotate corespunzător pentru colectarea datelor și implementare strategiei PAL in regim pilot: 105 versus 80
- 1 studiu de evaluare a nivelului de referinta a managementului cazurilor cu afectiuni respiratorii, la nivelul asistentei medicale primare.

SNSPMS

- **232 de persoane**, reprezentanti ai organizatiilor si institutiilor implicate in activitati de control al TB au fost instruite referitor la ACSM
- 1 studiu de identificare a nevoilor bolnavilor cu TB finalizat (suport pentru elaborarea strategiei ACSM)
- Strategia ACSM finalizata
- 1 film pentru factorii de decizie (ACSM) finalizat

Grantul Tuberculoza

ACTIVITATI PR

Activitati PR

- In semestrul al 4-lea activitatea M&E s-a centrat pe 2 directii principale:
 - A. acordarea de asistenta tehnica implementatorilor
 - B. colaborarea cu reprezentantii PNCT in vederea consolidarii activitatilor privind asistenta medicala a pacientilor cu TB si MDR-TB, colaborarea cu alte retele (PNCTP), integrarea programelor finantate de FG in programul national, etc.

A. Asistenta tehnica acordata implementatorilor

- Tuturor subrecipientilor:
 - Revizuirea si definitivarea anexelor aferente actelor aditionale pentru faza a 2-a.
- UIP TB ANP, CPSS, UIP TB Marius Nasta, SC, SNSPMS:
 - Analize, lucru cu SR, realocari bugetare pentru maximizarea rezultatelor proiectelor

A. Asistenta tehnica acordata implementatorilor

– UIP TB ANP

- suport pentru finalizarea achizitiei:
 - de platforma si module de e-learning
 - de licente MS Office pentru echipamentele IT achizitionate
 - Module de memorie server ANP pentru sustinerea aplicatiei de e-learning
 - Pentru asigurari echipamente IT, conform regulilor si principiilor Fondului Global
- TOR, procedura de achizitie, evaluare de oferte si implementare Conferinta “Controlul TB in penitenciare”-24 septembrie 2009

A. Asistenta tehnica acordata implementatorilor

– UIP TB “Marius Nasta”

- achizitia de medicamente transa a 2-a (august 2009)
- ancheta de supraveghere a chimiorezistentei (a fost initiata la 1 octombrie 2009 si se va finaliza la 31 ianuarie 2010)

– CNSMF:

- Achizitia de echipamente medicale pentru 150 de medici de familie (achizitie programata pentru faza a 2-a, dar derulata din faza 1)
- Asistenta tehnica pentru defitivarea contractelor de “dar manual”- donatia echipementelor catre 105 medici de familie

– CPSS:

- Achizitie consumabile sanitare (6 granturi de cercetare operationala)

B. Sustinere activitati PNCT

- 15-19 iunie 2009-vizita monitorizare GLC:
 - Au fost vizitate celel 2 centre MDR TB (Bucuresti si Bisericani)
 - Au fost evaluate aspecte referitoare la managementul cazului de MDR TB (colectare date, management medicamente de linia a 2-a, management tratament, management identificare caz, etc)
 - Au fost elaborate concluziile vizitei si au fost prezentate catre Ministerul Sanatatii (Conf. Dr. Alexandru Rafila, Prof. Dr. Molnar Geza)

B. Sustinere activitati PNCT

- Principalele concluzii si recomandari ale vizitei GLC:
 - Centralizarea sistemului de achizitie de medicamente
 - Extinderea cohortei GLC pentru toate cazurile MDR TB din Romania
 - Utilizarea la capacitate maxima a celor 2 centre MDR TB de la Bisericiani si Bucuresti
 - Realizarea unui plan de control al infectiei TB in dispensare, spitale si laboratoare

B. Sustinere activitati PNCT

- Septembrie 2009 a fost numita o noua echipa de management al PNCT
- Septembrie-octombrie 2009-au fost desfasurate activitati de informare a noi echipe PNCT referitor la:
 - Rezultatele vizitelor de evaluare PNCT: OMS-ECDC si GLC
 - Proiectele FG: scop, obiective, rezultate si nevoi de asistenta tehnica din partea PNCT

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres

- Al patrulea Raport de Progres si Cererea de Finantare va fi transmis catre LFA si FG inaintea termenului-limita (15 noiembrie 2009), conform solicitatii FG
- Informatii suplimentare:

www.fondulglobal.ro

CLOSE OUT

Close Out

- In acordul de grant pentru faza a 2-a a grantului TB, Fondul Global nu a mentionat inca o data la care va transmite Primitorului Principal o scrisoare de implementare cu privire la procedura de inchidere a proiectelor.
- Cel mai probabil (din experienta grantului HIV) putem anticipa ca FG va emite o conditie speciala referitoare la inchiderea grantului TB, urmata de o scrisoare de implementare in apropierea ultimului an de implementare (2011- 2012).

Close Out

- Tot din experienta grantului HIV/SIDA, estimam ca PR-ul va trimite catre FG spre aprobare planul de inchidere in penultimul trimestru al grantului – conform acordului corespunzator fazei a 2-a.
- Scrisorile de implementare catre SR vor fi transmise la inceputul ultimului trimestru de derulare a proiectelor, pentru ca acestia sa poata efectua, acolo unde cazul, activitatile conexe inchiderii proiectelor (ex. donatii de obiecte de inventar sau de mijloace fixe).

Close Out

- Inchiderea proiectelor implica in esenta pentru sub-recipienti intocmirea si transmiterea la timp (conform acordului de sub-finantare) a urmatoarelor documente:
 - Raportul trimestrial corespunzator ultimului trimestru al proiectului si a
 - Raportul anual corespunzator anului 5 de implementare intr-un format usor modificat

Close Out

- De asemenea, sub-recipientii au obligatia de a primi vizita auditorului independent pentru auditarea ultimului an de raportare.


Close Out

- **Toate cheltuielile** necesare inchiderii proiectelor vor fi suportate din bugetele individuale ale sub-recipientilor si PR.
- FG nu va aproba transferuri suplimentare de fonduri, in afara sumelor comunicate de catre Board-ul FG in scrisorile si documentele aferente deciziei de continuare a fazei a 2-a a granturilor.

GRANTUL TUBERCULOZA


RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

**Raport comparativ: buget contractat cu FG - fonduri distribuite catre PR de FG -
fonduri distribuite catre SR de PR - fonduri cheltuite, aferent Fazei intai (01
Octombrie 2007 - 30 Septembrie 2009)**

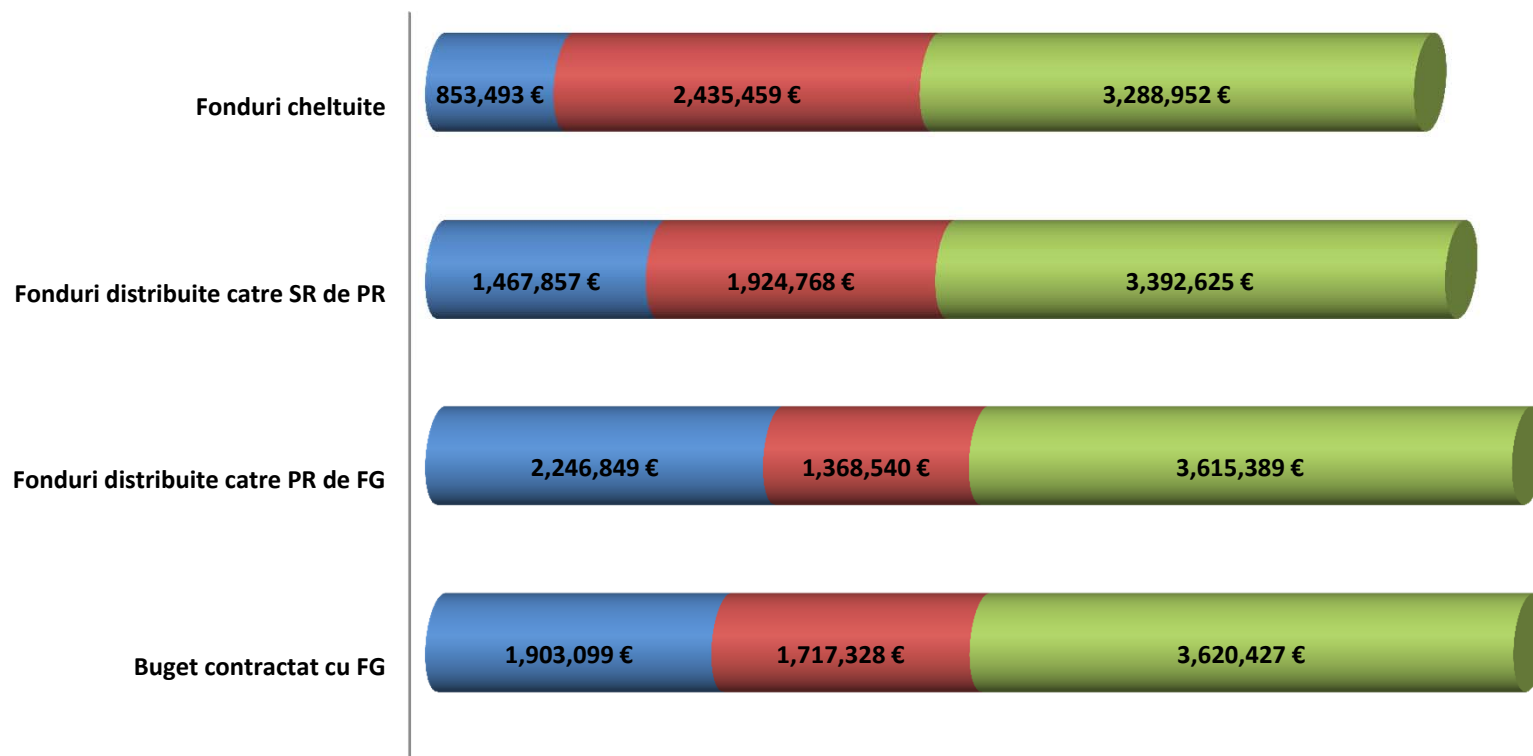

	Buget contractat cu FG	Fonduri distribuite catre PR de FG	Fonduri distribuite catre SR de PR	Fonduri cheltuite
■ Anul I (1 Oct. 07-30 Sep. 08)	1,903,099 €	2,246,849 €	1,467,857 €	853,493 €
■ Anul II (1 Oct. 08-30 Sep. 09)	1,717,328 €	1,368,540 €	1,924,768 €	2,435,459 €
■ TOTAL	3,620,427 €	3,615,389 €	3,392,625 €	3,288,952 €

Concluzii

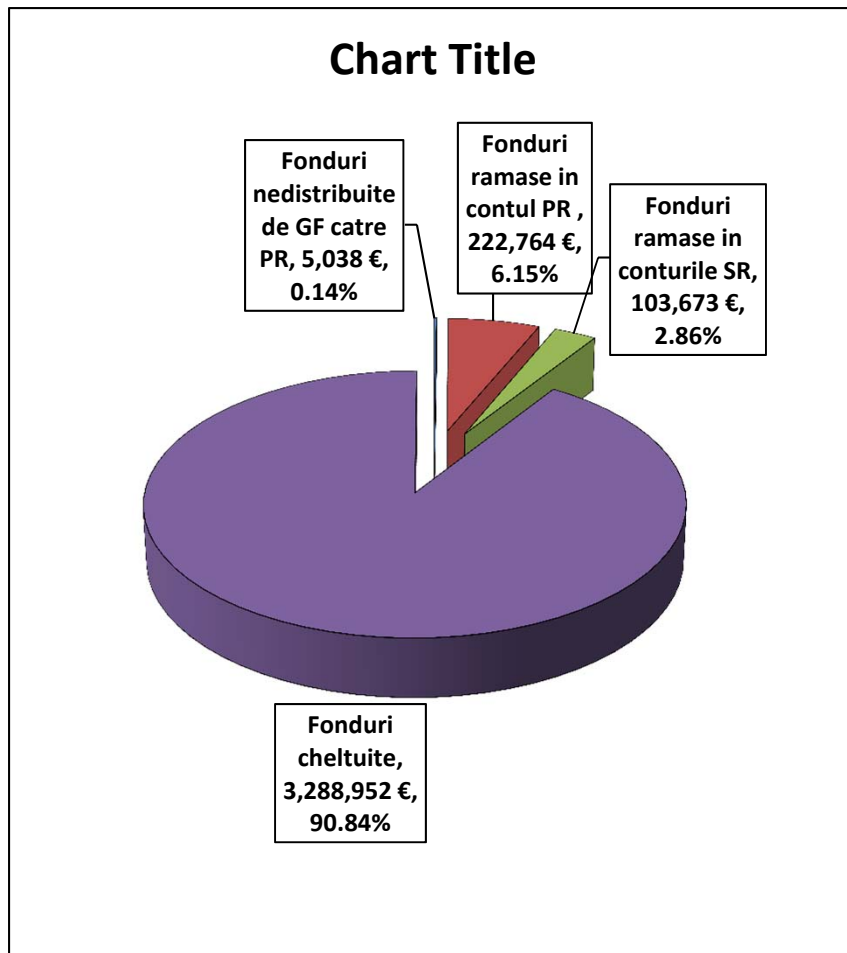

- In Faza I de Implementare a Grantului, rata de cheltuire a fondurilor (fata de bugetul contractat) a fost de 90,842%. Procentul mic se datoreaza intarzierii unor activitati ale ANP.
- 0,14% din buget reprezentand fonduri nedistribuite de FG reprezinta bani necheltuiti din bugetul Secretariatului CCM, bani ce vor fi folositi in Faza II ca suplimentare a deficitului de cash din buget;
- 154,483 Euro reprezentand valoarea TVA au fost ceruti si recuperati de la bugetul de stat, suma care se va suplimenta cu aprox. 48,744 Euro reprezentand TVA de recuperat pentru trimestrul 3 al anului 2009;
- TVA-ul recuperat aferent Fazei I va fi utilizat in Faza II de implementare a activitatilor pentru acoperirea deficitului de buget;

Achizitii realizate

- Achizitii PR
 - Medicamentele antituberculoase de linia a 2-a pentru bolnavii cu MDR-TB de la GLC-IDA – a doua livrare efectuata in august 2009
 - Servicii de vanuire-depozitare-distributie a medicamentelor de linia a 2-a de la S.C. UNIFARM S.A.
 - Echipamente medicale pentru medicii de familie care vor implementa strategia PAL in regim pilot – pentru inca 150 MF ce vor fi implicati in proiect in Faza 2 achizitionate in iunie-iulie 2009
 - Auditul extern in valoare de 20.230 Euro, a fost finalizat pana la 15 Iunie 2009.
 - Consumabile sanitare pentru depistare TB in cadrul proiectului O4 SDA3 implementat de CPSS – achizitie desfasurata in august 2009
 - 24 septembrie 2009 - organizare conferinta de presa si conferinta de diseminare rezultate proiecte implementate de UIP-TB ANP; achizitie derulata in august 2009
- Achizitii SR
 - CPSS, Salvati Copiii si SNSPMS – achizitiile au fost realizate conform planificarii.
 - ANP – achizitiile au fost finalizate cu asistenta si suport PR.

GRANTUL HIV

RAPORT PROGRAMATIC

Situatia programului HIV/SIDA Rd 6 la finalul Fazei I

Din cei 14 indicatori cheie:

- ✓ 9 au fost depasiti (>100%)
 - ✓ 1 realizat in proportie de 85% (testare HIV in randul grupurilor vulnerabile);
 - ✓ 1 realizat in proportie de 80% (distributia de prezervative);
 - ✓ 1 realizat in proportie de 74% (prevenire in randul SWs);
 - ✓ 1 realizat in proportie de 72% (prevenire in randul SWs si IDUs din aresturi);
 - ✓ 1 realizat in proportie de 55% (prevenire in randul detinurilor);
-
- Pentru detalii despre progresul la sfarsitul Fazei I, consultati al patrulea raport de progres, la <http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/hiv-sida/> .

Situatia studiilor BSS si a evaluarilor realizate in Faza I

- **BSS in randul IDUs** – un draft al raportului de cercetare a fost disponibil la sfarsitul Fazei I. Raportul final este in prezent circulat in grupul de M&E si va fi lansat in Noiembrie 2009.
- **BSS in randul PLWHAs** – un draft al raportului de cercetare a fost disponibil la sfarsitul Fazei I. Raportul a fost circulat in grupul de M&E si a fost lansat in Octombrie 2009 – disponibil si pe [http://www.fondulglobal.ro/plain/files/Ancheta Comportamentala Tineri HIV SIDA- Raport 2009 RAA.pdf](http://www.fondulglobal.ro/plain/files/Ancheta_Comportamentala_Tineri_HIV_SIDA- Raport 2009 RAA.pdf)
- **BSS in randul SWs** – analiza preliminara a datelor s-a incheiat la inceputul lui iulie 2009. Raportul final va fi lansat in Decembrie 2009.
- **BSS in randul persoanelor private de libertate** – analiza preliminara a datelor s-a incheiat la inceputul lui iulie 2009. Raportul final va fi lansat in Decembrie 2009.
- **Evaluarea serviciilor de integrare socio-profesionala a tinerilor seropozitivi** – a fost realizata de un evaluator extern in iulie 2009. Raportul final va fi disponibil in Noiembrie 2009.

Ce indica rezultatele studiilor?

YPLWHAs:

- 18% dintre fete au avut cel puțin o sarcină
- 97% dintre copii s-au născut după diagnosticarea cu HIV a părintelui
- Recunoașterea corectă a metodelor PMTCT (27% - 15% băieții, 36% fetele)
- 66% au auzit de ITS
- Vârsta medie a debutului sexual: 16.8 ani
- Media numărului de parteneri în ultimele 12 luni în rândul tinerilor care și-au început viața sexuală este de 1,87 (băieți - 2,65, fete - 1,24)
- Dintre cei care au avut un partener stabil în ultimul an, 63% aveau partener seronegativ
- 66% au utilizat prezervativul la ultimul contact sexual

Ce indica rezultatele studiilor?

IDUs:

- Cca 70% isi injecteaza droguri de mai mult de 6 ani
- 53% se injecteaza de 2-3 ori/zi
- 23% au folosit prezervativul la ultimul contact sexual
- 85% declara ca au folosit echipament steril la ultima injectare

DAR:

- Prevalenta HIV – 1%
- Prevalenta VHC – 83% (mult mai ridicata in randul barbatilor)
- Prevalenta VHB - 5%

Ce indica rezultatele studiilor?

SWs:

- Cca 50% (Bucuresti) si 74% (orasele din tara) declara ca au utilizat prezervativul la ultimul contact sexual
- 51% (Bucuresti) au folosit cel putin o data in viata droguri injectabile, procentul SWs din tara care au folosit droguri injectabile este foarte mic (<1%)

DAR (date colectate doar in Bucuresti):

- Prevalenta HIV – 1%
- Prevalenta VHC – 32%
- Prevalenta VHB - 4%

Ce indica rezultatele studiilor?

Persoane private de liberate:

- 38% au avut cel puțin un partener sexual în ultimele 12 luni
- 22% dintre cei care au făcut sex în ultimele 12 luni au folosit prezervativul la toate contactele sexuale
- Cc 20% facusera sex în ultimele 30 de zile
- 14% au folosit prezervativul la ultimul contact sexual (indiferent când a avut loc acesta)
- 42% dintre cei care au consumat vreodata droguri, și-au injectat droguri în ultimele 12 luni

DAR (date colectate doar în București):

- Prevalența HIV – 1%
- Prevalența VHC – 18% (Jilava, Colibasi, Târgșor, Giurgiu), 6% (celelalte penitenciare)
- Prevalența VHB - 11% (Jilava, Colibasi, Târgșor, Giurgiu), 4% (celelalte penitenciare)

Ce indica rezultatele studiilor?

Evaluarea serviciilor de integrare socio-profesionala adresate persoanelor seropozitive:

- Consilierea pentru integrare profesionala are:
 - Rol in motivarea tinerilor pentru a participa in programe de integrare profesionala (cursuri, ateliere)
 - Rol in diminuarea diferentelor dintre asteptarile tinerilor si resursele acestora legate de integrarea profesionala
- Cursurile de formare profesionala → eficacitate mai mare a celor organizate in cadrul atelierelor de terapie ocupationala comparativ cu cele organizate de catre AJOFM
- Angajarea in unitati protejate → solutie pe termen lung pentru tinerii cu nivel scazut de scolarizare, solutie pe termen scurt pentru cei cu sanse mari de integrare pe piata muncii.
- Stagiile de practica la angajatori → este de asteptat ca impactul acestora sa fie vizibil pe termen lung
- Instruirea specialistilor → este necesara continuarea programelor de instruire a specialistilor care ofera servicii de integrare profesionala tinerilor care traiesc cu HIV.

Close out

- 18 proiecte incheiate la sfarsitul fazei I – 30 iunie 2009
- 13 implementatori au incheiat unul sau mai multe proiecte
- Proceduri close out:
 - Raport narativ si financiar Q8 (termen limita: 10 iulie 2009)
 - Raport anual pentru anul II de proiect, care include si informatii despre achizitiile realizate in proiect, situatia stocurilor la 30 iunie 2009 si explicatii referitoare la modul de utilizare a produselor ramase in stoc (termen limita: 30 iulie 2009)

Activitati M&E ale PR

- Asistenta tehnica acordata implementatorilor:
 - Pregatirea anexelor si a actelor aditionale pentru faza a II-a (49 de proiecte continua in faza a II-a, 23 implementatori)
 - Proceduri de close out pentru 13 SRs
- 17 vizite de M&E in perioada mai – octombrie 2009
- Training pentru personalul din penitenciare - “Abilitati de consiliere si testare voluntara pentru HIV si VHC”, organizat de RAA si ANP

Aspecte critice de urmarit in Faza II

- 1) Recuperarea tintelor pentru testarea HIV in randul IDUs, SWs, Roma si copiii strazii atat in outreach (ARAS), cat si in clinica ARENA (ARAS).
- 2) Continuarea activitatii de testare HIV in randul detinutilor, exclusiv de catre ANP (dupa desfiintarea ANA in mai 2009).
- 3) Continuarea activitatii de testare HIV in randul MSM (de catre ACCEPT – activitate noua, din Q8, in cadrul proiectului de prevenire HIV prin outreach).
- 4) Continuarea activitatii de prevenire in randul SWs si IDUs din aresturi (MAI) si recuperarea indicatorilor (la 30 Oct. 2009, MAI inca nu semnase acordul pentru Faza II, desi documentele au fost transmise de RAA in luna iulie 2009, solicitand renegocierea indicatorului cheie).
- 5) Revizuirea interventiilor de prevenire adresate grupurilor vulnerabile, in urma analizei datelor obtinute prin studii.

Interventii ale PR pentru depasirea aspectelor critice

- 1) Proiect MAI: RAA a inaintat mai multe adrese conducerilor din ultima perioada ale Directiei Medicale, explicand motivele pentru care tintele indicatorului cheie nu pot fi renegociate, ajungand in final la o intelegere. RAA asteapta semnarea acordului la inceputul lui Noiembrie.
- 2) Proiect ANP: RAA a semnat acord de subfinantare cu ANP pentru continuarea activitatii de testare HIV (si VHC) in randul detinutilor. RAA & Directia Medicala a organizat curs VCT pentru personalul medical & socio-educativ din 36 de penitenciare. RAA a achizitionat toate materialele sanitare si nesanitare necesare desfasurarii activitatii VCT in 38 de penitenciare. Indicatori: 4.000 detinuti testati pentru HIV si VHC pana la finalul Fazei II.
- 3) Testare HIV in randul MSM: in masura in care va identifica economii, PR va directiona fonduri si pentru testarea HIV a MSM (teste & salariu consilier VCT).

Interventii ale PR pentru depasirea aspectelor critice (cont.)

- 4) Analiza datelor obtinute prin studii in vederea evaluarii si imbunatatirii interventiilor de prevenire destinate grupurilor vulnerabile. Analizele vor avea loc in grupurile de M&E si in baza lor vor fi formulate recomandari pentru SRs.

GRANTUL HIV


RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

**Raport comparativ: buget contractat cu FG - fonduri distribuite catre PR de FG -
fonduri distribuite catre SR de PR - fonduri cheltuite, aferent Fazei intai (01 Iulie
2007 - 30 Iunie 2009)**



	Buget contractat cu FG	Fonduri distribuite catre PR de FG	Fonduri distribuite catre SR de PR	Fonduri cheltuite
■ Objectiv 1	3,866,791 €	3,866,791 €	3,765,914 €	3,782,763 €
■ Objectiv 2	2,241,063 €	2,241,063 €	2,240,512 €	2,166,698 €
■ Objectiv 3	496,106 €	449,880 €	427,406 €	418,538 €
■ TOTAL	6,603,960 €	6,557,734 €	6,433,831 €	6,367,999 €

Concluzii

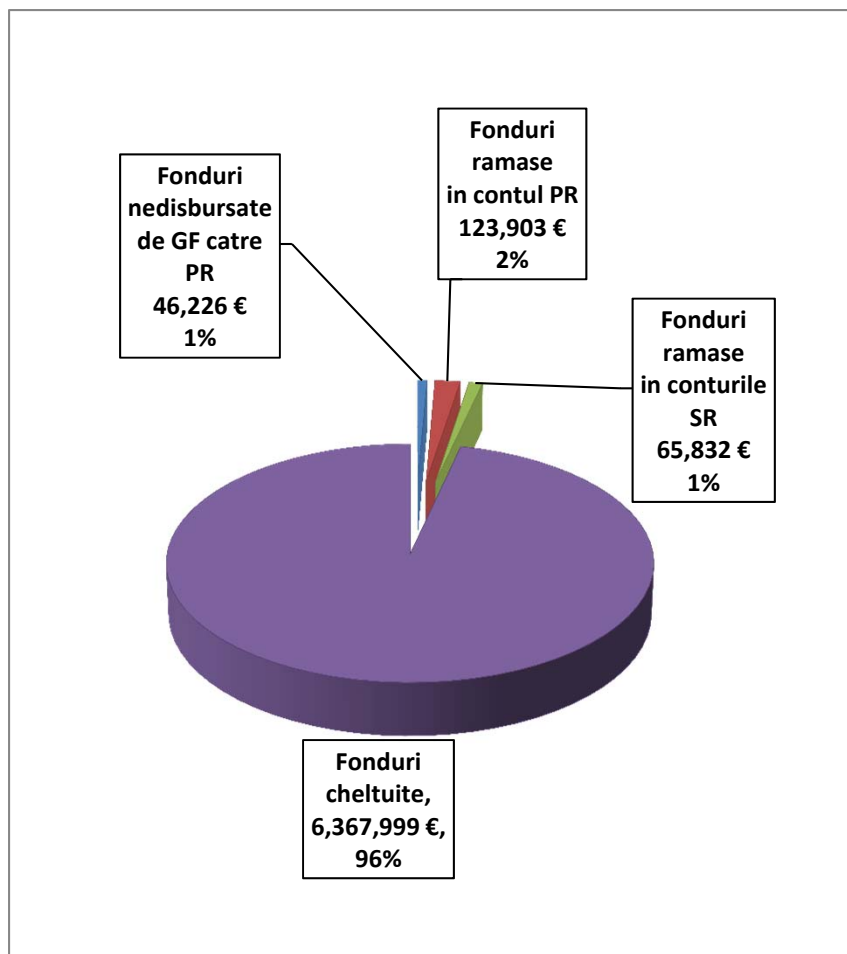

- In Faza I de Implementare a Grantului, rata de cheltuire a fondurilor (fata de bugetul contractat) a fost de 96,42%. Procentul mare se datoreaza, in principal, achizițiilor de consumabile sanitare si echipamente necesare implementarii proiectului in Faza II;
- Nedistribuirea de catre FG a fondurilor bugetate in Faza I de implementare, se datoreaza ratei mici de absorbtie a fondurilor pe O3-SDA2, bugetul aferent Secretariatului CCM;
- Banii nedisbursati (46,226 Euro) vor fi folositi in Faza II ca suplimentare a deficitului de cash din buget;
- 326,086 Euro reprezentand valoarea TVA au fost ceruti si recuperati de la bugetul de stat, suma care se va suplimenta cu aprox. 12,776 Euro reprezentand TVA de recuperat pentru trimestrul 3 al anului 2009;
- TVA-ul recuperat aferent Fazei I va fi utilizat in Faza II de implementare a activitatilor pentru acoperirea deficitului de buget;

Achizitii realizate PR

Consumabile sanitare	Cantitate achizitionata			Unitate masura
	Anul 1	Anul 2	Total	
Siringi insulina	1,147,300	2,104,999	3,252,299	bucata
Apa distilata	53,027	162,215	215,242	bucata
Tampoane alcool	1,265,300	259,700	1,525,000	bucata
Plasturi post-injectare	21,300	78,588	99,888	bucata
Recipiente colectare obiecte intepatoare	2,000	1,160	3,160	bucata
Teste rapide HIV	3,800	16,485	20,285	bucata
Teste rapide HVC	800	1,260	2,060	bucata
Teste rapide HVB	-	480	480	bucata
Unguent cu heparina	1,000	750	1,750	bucata
Dezinfectanti maini	5	258	263	litri
Dezinfectanti suprafete	5	666	671	litri
Ace	-	6,400	6,400	bucata
Manusi examinare	-	70	70	cutie
Truse medicale	-	20	20	bucata
Lubrifianti	-	123,300	123,300	bucata
Vaccin anti-HVB	-	150	150	bucata
Prezervative	-	3,354,900	3,354,900	bucata
Vacutainer	-	900	900	bucata
Garou	-	21	21	bucata

- Auditul extern aferent anului 2008 a fost finalizat conform planificarii pana la 15 iunie 2009.
- In luna octombrie 2009 s-au achizitionat pentru proiectul implementat de ANP: 3.000 teste rapide HIV, 4.000 teste rapide HVC.
