

Raport asupra Progresului Implementarii Granturilor GFATM HIV/SIDA si TB – Runda a 6-a

INTALNIREA
COMITETULUI NATIONAL DE
COORDONARE
- 9 SEPTEMBRIE 2008 -

Abrevieri & Resurse:

- FG / GFATM: Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei www.theglobalfund.org
- Site-ul dedicat programelor finantate de FG – Runda a 6-a in Romania: www.fondulglobal.ro / www.globalfund.ro
- LFA / Local Fund Agent - Agentul Local al Fondului Global (Firma KPMG)
- CNC-FG: Comitetul National de Coordonare a Programelor HIV/SIDA si TB Finantate de Fondul Global www.ccmromania-gfatm.com
- RAA: Fundatia Romanian Angel Appeal – Primitor Principal al granturilor HIV/SIDA si TB finantate de Fondul Global www.raa.ro
- PR: Primitorul Principal
- SRs: Sub-recipienti / Implementatori – organizatii (institutii si ONG) cu care Primitorul Principal a incheiat un Acord de Sub-finantare
- ANP: Administratia Nationala a Penitenciarelor

GRANTUL HIV/SIDA

Grantul HIV/SIDA – Progres General

Al doilea Semestru de implementare s-a caracterizat prin:

- Efortul SRs de a atinge tintele planificate;
- Numeroase vizite de monitorizare si evaluare efectuate de echipa RAA (practic toate proiectele au fost acoperite: 59 proiecte sub-contractate unui numar de 26 SRs);
- Auditul Financiar corespunzator 2007 a fost realizat cu respectarea termenului limita cerut de FG (15 iunie '08);
- Eforturile RAA de a selecta si sub-contracta SRs pentru programul din penitenciare (respins de ANP la finele 2007);
- Efortul RAA de a identifica si sub-contracta un nou SR capabil sa continue implementarea Centrului de Urgenta din Galati si de a solutiona problema spatiului Centrului;
- Continuarea eforturilor de solutionare a problemei TVA si de asigurare a sustenabilitatii programelor.

Grantul HIV/SIDA – Progres General

Indicatori:

- 7 dintre indicatorii cheie au fost depasiti ($>100\%$);
- 7 dintre indicatorii cheie au fost realizati partial, in proportii variind intre **0%** si **65%**;
- Din cei 7 indicatori realizati partial, 5 sunt afectati de valoarea **0 (zero)** inregistrata si in acest semestru de activitatile de prevenire in penitenciare (ANP) si in aresturile politiei (MIRA);
- 2 indicatori comportamentali au fost masurati (cei legati de comportamentele MSM);
- 4 indicatori comportamentali sunt planificati a fi masurati pana la finele trimestrului 6 (Q6).

Dificultati

- Intarzieri de implementare (4 trimestre) pana la identificarea unor noi subrecipienti pentru programul de prevenire HIV;
- Intreruperea temporara (1 trimestru) a activitatilor derulate in Centrul de Urgenta din Galati, pana la identificarea implementatorului care a preluat activitatea (Fundatia Inima de Copil);
- Dificultati tehnice (programatice, financiare) de implementare la unele organizatii de PLWHAs: a fost necesara acordarea de asistenta tehnica si adoptarea unor planuri de implementare revizuite, propuse de PR.

Dificultati

- Implementatorii din aria programelor destinate PLWHAs reclama un interes scazut al tinerilor seropozitivi pentru implicarea in programe de integrare socio-profesionala;
- In anumite locatii, numarul de FSWs si de IDUs atinsi prin programele de outreach, este mult mai mic decat cel asteptat. Din acest motiv implementatorii exploreaza posibilitatea adoptarii unor noi tipuri de interventii de prevenire destinate acestor grupuri.

Grantul HIV/SIDA – Runda a 6-a

Concluzii:

În ciuda dificultăților întâmpinate, realizările acestei perioade includ:

- Sub-contractarea tuturor ariilor și activităților programului;
- Monitorizarea și evaluarea activității tuturor SRs;
- Organizațiile mici de PLWHA au primit asistență tehnică din partea PR pentru creșterea capacității tehnice de implementare;
- Rapoartele de monitorizare și evaluare indică (cu foarte mici excepții) că implementarea este pe o direcție bună și că sunt șanse foarte mari ca întârzierile în realizarea indicatorilor-cheie să fie recuperate pe parcursul celui de al III-lea semestru.

Vizite de monitorizare si evaluare efectuate de echipa RAA



Ambulanta sociala
ARAS Bucuresti



Sera
Asoc.Speranta, Constanta



ADV Targu Mures



Curs formare personal MIRA
TNT

Grantul HIV/SIDA – Runda a 6-a

Raport de Progres si Rating

- Al Doilea Raport de Progres si Cererea de Finantare au fost transmise catre LFA si FG cu respectarea termenului-limita
 - Raportul este disponibil pe www.fondulglobal.ro
- Ratingul obtinut pentru Semestrul II de implementare este B1 = Implementare Adekvata
 - Raportul este disponibil pe www.theglobalfund.org

Fundatia Alaturi de Voi (ADV)

Scoala de vara pentru YPLWHA



Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS)

Activitati de teren destinate persoanelor care practica sexul comercial



Romanian
Angel Appeal

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor (FDP)

Curs de instruire pentru furnizorii de servicii psihosociale destinate YPLWHAs – martie 2008



Fundatia Baylor Marea Neagra

Consiliere pentru orientarea profesionala a tinerilor seropozitivi



Fundatia Inima de Copil, Galati

Atelier vocational



Asociatia Integration

Schimb de seringi in Bucuresti




Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS)

Drepturile persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile – intalnire cu autoritatile locale Bucuresti



UNOPA

Conferința Națională “HIV/SIDA și locul de muncă”

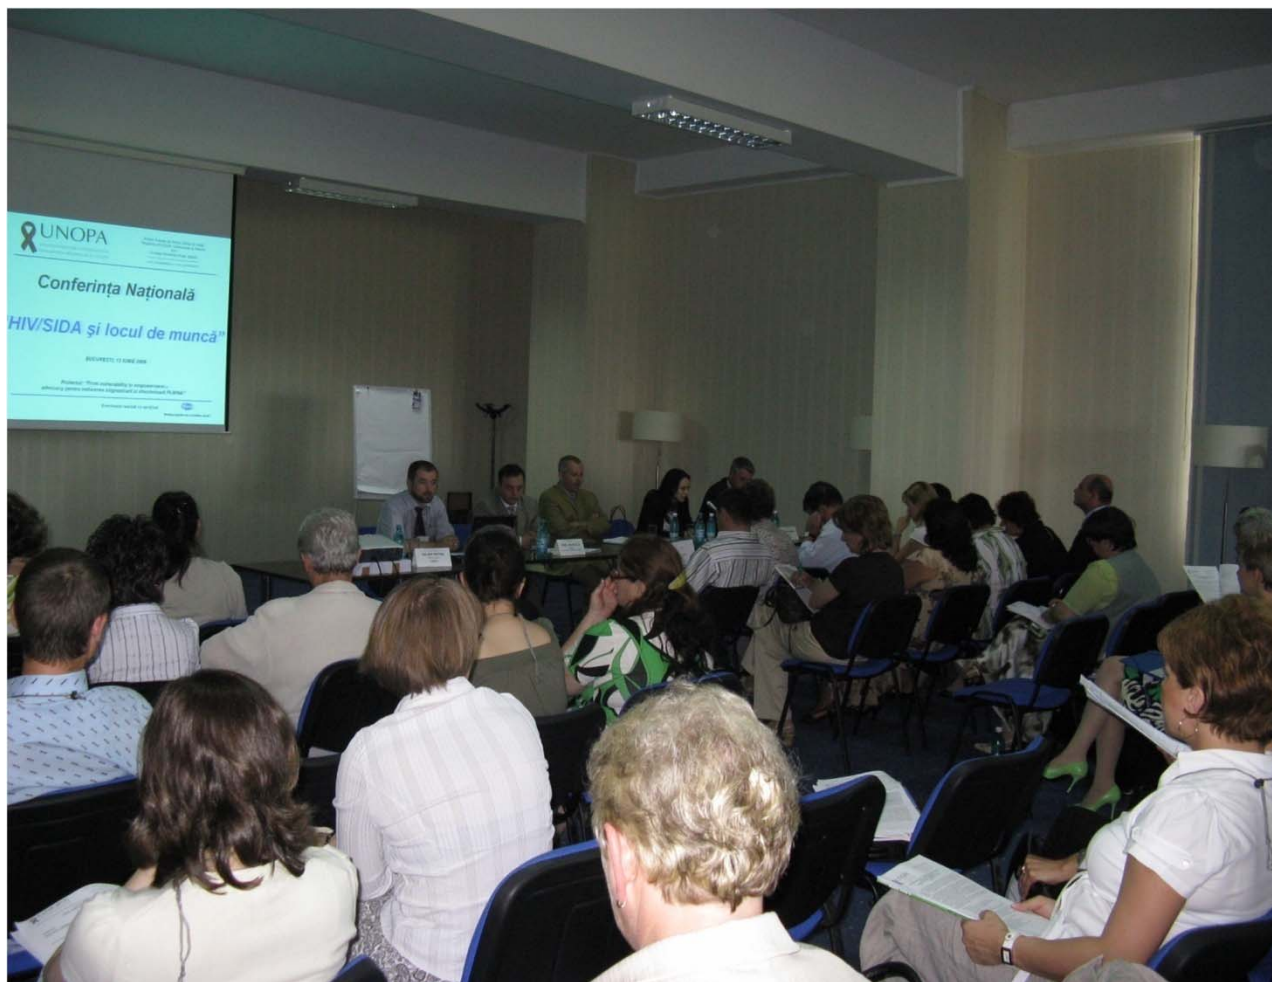

Top Sub-recipienti

(care merita felicitarile noastre speciale)



Pentru indeplinirea simultana a 5 criterii:


- corectitudine financiara
- profesionalism in implementare
- rapoarte trimestriale de calitate
- respectarea termenelor
- raspunsul rapid la solicitari

- **Fundatia Alaturi de Voi (ADV)**
- **UNOPA**
- **Health AID Romania (HAR)**
- **Fundatia Baylor Marea Neagra**
- **Fundatia Inima de Copil**



Consideratii Financiare

Raport anual privind fondurile primite vs. fonduri distribuite catre SR

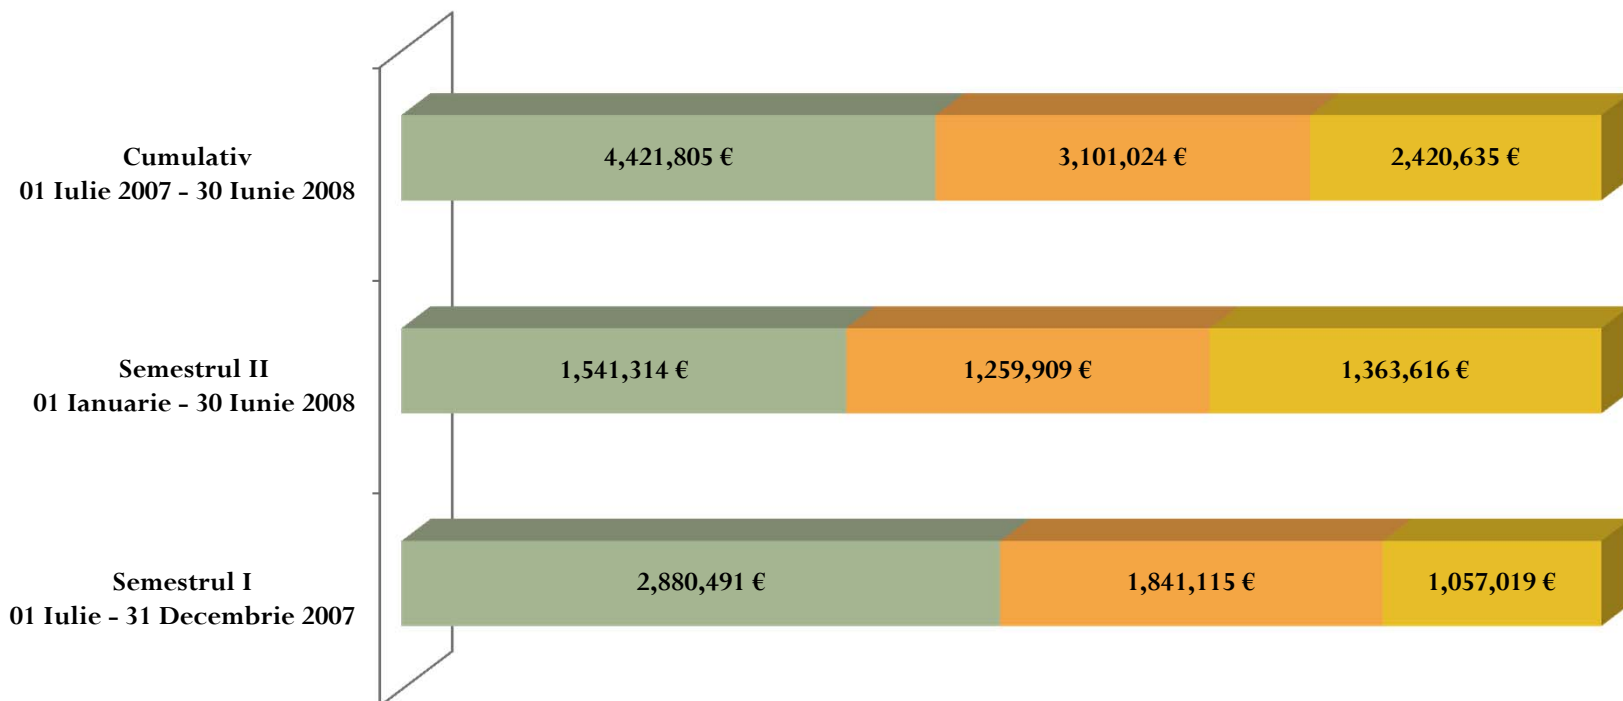

	Semestrul I 01 Iulie - 31 Decembrie 2007	Semestrul II 01 Ianuarie - 30 Iunie 2008	Cumulativ 01 Iulie 2007 - 30 Iunie 2008
Fonduri primite	2,880,491 €	1,541,314 €	4,421,805 €
Fonduri distribuite catre SR	1,841,115 €	1,259,909 €	3,101,024 €
Fonduri cheltuite de SR	1,057,019 €	1,363,616 €	2,420,635 €

Consideratii Financiare

- Pana in prezent 70% din fondurile primite pentru primul an de proiect au fost distribuite Implementatorilor
- Procentul de 30% fonduri nedistribuite include si suma de 955.887 euro, reprezentand trimestrul tampon pentru perioada Iulie – Septembrie 2008
- Cheltuielile Implementatorilor reprezinta 78% din totalul fondurilor distribuite catre acestia

Consideratii Financiare

Opinia auditorului independent asupra situatiilor financiare pentru perioada 1 Iulie 2007 – 31 Decembrie 2007

“In opinia noastra, situatiile financiare prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, veniturile colectate si cheltuielile platite in perioada 1 iulie 2007 – 31 decembrie 2007, in conformitate cu baza contabila de inregistrare la momentul efectuarii incasarilor si platilor, asa cu este descrisa in Capitolul 5 - Politici contabile semnificative.”

Auditor MID Consulting SRL, Iulie 2008

Achizitii PR

- **Achizitia de prezervative**

- Amanata cu mai mult de un trimestru datorita nerezolvarii co-finantarii pentru TVA – negociere indelungata cu UNFPA cu care s-a semnat cost-sharing agreement la inceputul lunii Iulie (daca nu s-ar fi procurat prin UNFPA, s-ar fi platit TVA, caz in care bugetul prevazut ar fi fost insuficient)
- Nevoile programului au fost acoperite din donatii.

Achizitii PR

- **Achizitia de consumabile sanitare prin sistemul UNDP** (seringi, apa distilata, plasturi, tampoane alcoolizate, etc.)
 - Amanata cu mai mult de 2 luni. Regulile UNDP impun ca pentru orice achizitie mai mare de 100,000 USD sa se solicite aprobarea finala a biroului din Bratislava.
 - Pentru primul an de implementare al programului s-au procurat 1,147,300 seringi insulina fata de 1,063,000 seringi estimate pentru ARAS si ALIAT.
 - Apa distilata — s-au achizitionat 53,025 fiole din necesarul de 124,120 fiole datorita cresterii semnificative a costului unitar comparativ cu cel de la data acordului de grant.
 - Tampoane alcoolizate si plasturi post-injectare s-au achizitionat in proportie de 90% datorita aprobarii de catre UNDP Bratislava a unor sume maxime pe contractele cu furnizorii.

Achizitii (PR)

- **Achizitia de teste rapide HIV/HVC/HVB**
 - Amanata cu mai mult de un trimestru datorita nerezolvarii cofinantarii pentru TVA. RAA a lucrat cu UNDP, insa acesta din urma nu a primit oferte eligibile pentru aceasta achizitie. Ca urmare, RAA a organizat singura achizitia si a finalizat-o la mijlocul trimestrului 4 si in decursul trimestrului 5.
 - S-a achizitionat intregul necesar pentru cei 2 ani de implementare: 18,085 teste rapide HIV; 1,280 teste rapide HVC; 480 teste rapide HVB.

Achizitii PR

- **Alte consumabile sanitare:** recipiente de colectare, unguent cu heparina, dezinfectanti, manusi de examinare, vaccin antiHVB, tampoane alcoolizate, ace, s-au achizitionat integral cantitatile necesare pentru cei 2 ani de implementare ai programului.

Achizitii SRs - Consideratii Generale

- Majoritatea SR au realizat achizitiile conform planificarii.
- Exceptii:
 - I Nostri Bambini proiectul O2S6A5I18 “Sere de legume si plante ornamentale” - constructia si echiparea serei planificata pentru Q3 nu a inceput nici pana la finele lui Q4.
 - MIRA proiectul O1S1A11I8 “Adoptarea unor cunoștințe, practici și comportamente adecvate privind grupurile vulnerabile aflate în aresturile temporare de poliție” – trusele de prim ajutor planificate pentru Q3 nu au fost achizitionate pana la sfarsitul lui Q4.
 - ARAS proiectul O1S1A2I2 “Clinica usor accesibila ARENA” – 2 containere planificate pentru Q1 neachizitionate pana la sfarsitul lui Q4.

GRANTUL TUBERCULOZA

Grantul TB – Progres General

Primul Semestru (Octombrie 2007- Martie 2008) s-a caracterizat prin:

- Revizuirea anexelor si incheierea acordurilor de sub-finantare, urmate de initierea activitatilor:
 - CPSS: 18.12.2007
 - SNSPMS: 17.01.2008
 - Salvati Copiii: 28.01.2008
 - Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”: 27.02.2008
 - CNSMF: 11.03.2008
 - ANP: 09.07.2008
 - CRR: Activitati prevazute in cursul anului II

Grantul TB – Progres General

Indicatori (primul semestru):

Din cei 17 indicatori- cheie, pentru 11 era prevazuta raportare la sfarsitul Semestrului I.

- 4 indicatori- cheie au fost depasiti ($>100\%$);
- 6 au fost partial realizati in proportii variabile intre 49-96%;
- 1 indicator cu nivel 0, corespunzator activitatilor care ar fi trebuit implementate de catre ANP;

Rating-ul acordat Grantului TB pentru primul semestru de implementare: B1 (implementare adecvata).

Grantul TB – Progres General

Al doilea Semestru (perioada Aprilie – Iulie '08)

- Strategia Nationala IEC si de comunicare cu mass-media elaborate ;
- site-ul tbnews.ro, realizat, functional in cadrul proiectului CPSS;
- 31 caravane in 69 localitati pentru activitati de IEC la nivelul comunitatilor: 3.230 persoane atinse (cumulat cu Sem.I: 4.030 pers., 36 caravane, in 79 localitati), la care se adauga: 174 copii/tineri fara adapost (476 cumulativ);

Indicator- cheie: Nr. Persoane din comunitati vulnerabile care au beneficiat de interventii IEC: **4.506** pana la 30.06.2008

Salvati Copiii

Prevenirea TB in randul copiilor si tinerilor fara adapost



CPSS

Educatie pentru prevenirea TB in comunitatile defavorizate
prin caravane mobile



CPSS

Educatie pentru prevenirea TB in comunitatile defavorizate prin caravane mobile



Grantul TB – Progres General

Al doilea Semestru (perioada Aprilie – Iulie '08)

- Au fost achizitionate TV si DVD- playere pentru 223 unitati TB, care au primit si materiale educationale (film video);
- Au fost instruiti 35 jurnalisti asupra modului de reflectare a TB in mass- media;

Urmarea va fi inclusa in raportul de monitorizare a presei...

SNSPMS-CPSS

Curs de instruire a jurnalistilor in problematica TB



SNSPMS-CPSS

Curs de instruire a jurnalistilor in problematica TB



Grantul TB – Progres General

Al doilea Semestru (perioada Aprilie – Iulie '08)

- Elaborarea, multiplicarea si initierea distributiei ghidului pacientului cu MDR- TB;
- Au fost derulate o serie de ateliere de lucru, reuniuni pentru pregatirea unor activitati complexe: elaborarea unor curricule, module de instruire la distanta, strategie PAL, strategie ACSM, manualul de management al serviciilor de sanatate in controlul TB...etc..
- A fost trimisa cererea de extindere a proiectului DOTS- Plus la GLC;
- A fost elaborat un document preliminar al protocolului Anchetei de chimiorezistenta pentru substantele antituberculoase de linia a 2-a.

Grantul TB – Progres General

Al doilea Semestru (perioada Aprilie – Iulie '08)

- KAP survey referitor la TB in randul copiilor/ tinerilor fara adapost: 400 chestionare completate si introduse in baza de date, document preliminar disponibil;
- Materiale informative multe...
- A fost solicitata si primita aprobarea CCM pentru realocarea necesara asigurarii implementarii pentru proiectul de distribuire a stimulentei de catre Crucea Rosie.

Dificultati

- Intarzieri de implementare: revizuirea anexelor a durat mai mult timp decat a fost estimat initial; acordurile de sub- finantare au fost semnate cu intarziere;
- De subliniat intarzierea extrem de mare (3 trimestre) cu care s-a reusit incheierea acordului de sub-finantare cu ANP: modificari succesive ale persoanelor la conducerea ANP, verificari interne la nivelul UIP-urilor care implementeaza proiecte cu finantare de la Fondul Global;
- Solicitarea MSP de a revizui Normele de Implementare a PNCT in vederea aprobarii prin Ordin de Ministru: acesta a fost unul din motivele care a dus la intarzierea intocmirii si trimiterii aplicatiei la GLC.

Dificultati

- Intarzierea derularii unor Misiuni din partea OMS si respectiv GLC au dus la inregistrarea unor decalaje initiale in implementarea activitatilor care au beneficiat de asistenta tehnica de la acest nivel. Aceste decalaje pot fi insa recuperate pe parcursul derularii activitatilor:
 - Misiunea GLC: 14- 18 martie 2008
 - Misiunea OMS pentru PAL: 24- 28 martie 2008
 - A 5-a Reuniune Balcanica pentru TB: discutarea protocolului DRS: 5-8 mai 2008.
- Intarzierea definitivarii planului de achizitii: inca nu a fost definitivata lista MF care vor participa la implementarea PAL in regim pilot.

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres si Rating

- Primul Raport de Progres si Cererea de Finantare au fost transmise catre LFA si FG cu respectarea termenului-limita
 - Raportul este disponibil pe www.fondulglobal.ro
- Ratingul obtinut pentru Semestrul I de implementare este B1 = Implementare Adekvata
 - Raportul este disponibil pe www.theglobalfund.org

Grantul TB – Runda a 6-a

Concluzii:

In ciuda dificultatilor intampinate, rapoartele de monitorizare si evaluare indica faptul ca implementarea este pe o directie buna si ca sunt sanse foarte mari ca intarzierile in realizarea indicatorilor-cheie sa fie recuperate in cea mai mare parte pe parcursul celui de al II-lea Semestru.

Indicatori care nu vor putea fi realizati:

- Ancheta de supraveghere a chimiorezistentei la substantele anti-TB de linia a 2-a.
- Nr. de persoane din sistemul penitenciar instruite: va fi doar partial realizat.

Top Sub-recipienti

(care merita felicitările noastre speciale)



Pentru indeplinirea simultana a 5 criterii:

- corectitudine financiara
- profesionalism in implementare
- calitatea raportarilor
- respectarea termenelor
- raspunsul rapid la solicitari

CPSS

Salvati Copiii

Sub-recipienti care ne “mananca” zilele



Pentru indeplinirea simultana a cel puțin 2 criterii din cele de mai jos:

- Superficialitate in tinerea evidentelor financiare
- Superficialitate in realizarea documentelor programatice
- Implementare sub standarde / neindeplinirea clauzelor contractuale
- Nerespectarea termenelor de raportare
- Reactie intarziata la solicitari


?????

Alte activitati conexe Grantului TB realizate de PR

- Revizuirea normelor de implementare ale PNCT, in vederea includerii unor recomandari ale Misiunii GLC;
- Demersuri pentru achizitionarea centralizata a medicamentelor antituberculoase la nivel national;
- Demersuri pentru recunoasterea si decontarea a 120 de zile spitalizare pentru bolnavii MDR- TB internati in cele 2 centre;
- Demersuri pentru achizitionarea medicamentelor antituberculoase de linia a 2-a de la GLC/ IDA pentru TOTI bolnavii de MDR- TB din tara.

Consideratii Financiare

Raport privind fondurile primite vs. fonduri distribuite catre SR pentru primul semestru (01 Octombrie 2007 – 31 Martie 2008)

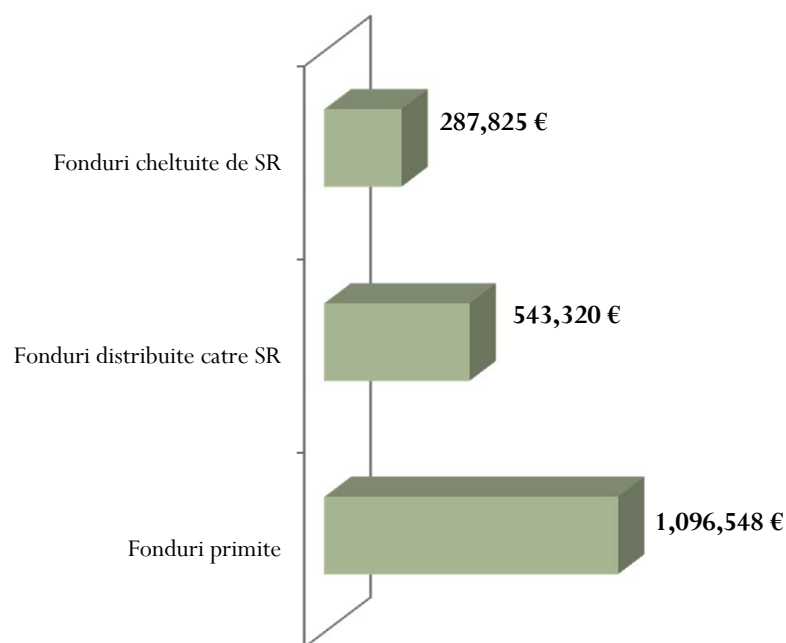

	Fonduri primite	Fonduri distribuite catre SR	Fonduri cheltuite de SR
■ Semestrul I 01 Octombrie 2007 - 31 Martie 2008	1,096,548 €	543,320 €	287,825 €

- Cauzele diferentelor intre fondurile primite (contractate cu GFATM) si fondurile distribuite Implementatorilor sunt:
 - Negocierile cu Implementatorii guvernamentali au durat mult, iar majoritatea Contractelor au fost semnate in Ianuarie 2008 (al doilea trimestru de implementare). Din aceasta cauza suma de 69.109 euro nu a fost distribuita in primul trimestru.
 - Negocierea si revizuirea planurilor de lucru si a bugetelor cu ANP a durat mai mult de 6 luni. Acesta este motivul pentru care suma de 81.064 euro planificata pentru implementarea proiectelor ANP nu a fost distribuita.
 - Contractul cu UNDP privind implementarea activitatilor CCM a fost semnat in Martie 2008, iar suma de 15.472 euro a fost distribuita in semestrul urmator.

Achizitii realizate

- Achizitii PR
 - RAA depune toate eforturile pentru achizitia de medicamente necesare continuarii tratamentului impotriva TB.
 - In perioada iulie-august 2008 a fost realizata achizitia serviciilor de consultanta – expert DRS.
- Achizitii SR
 - CPSS, Salvati Copiii si SNSPMS – achizitiile sunt realizate conform planificarii.
 - NASTA, CNSMF si ANP – achizitiile sunt intarziate fata de planificare si trebuie depuse eforturi sustinute pentru recuperarea intarzierilor.

Update TVA

Runda a 6-a

Co-finantarea pentru TVA

Stadiu Act normativ (OUG)

- *Ianuarie – Iunie 2008*

În perioada ianuarie-aprilie Fundatia RAA a pus la dispozitia noului Presedinte al CNC-FG proiectul de act normativ si intreaga documentatie solicitata;

- *Iunie 2008*

RAA solicita si obtine o audienta cu Dl. Eugen Nicolaescu, Ministrul Sanatatii, la care a participat si Dna. Cristina Barbuta, Director al Directiei Generale Bugete si Credite Externe din MSP. Alaturi de reprezentantii RAA la aceasta intalnire au luat parte si 2 membri CCM – Dna dr. Dana Farcasanu, CPSS si Dl. Iulian Petre, UNOPA;

- Ca urmare a intalnirii cu reprezentantii Fundatiei RAA, MSP a transmis catre MEF proiectul de act normativ si documentele de suport;

- *August 2008*

Fundatia RAA solicita si obtine audienta la MEF. Dosarul este in curs de solutionare, fiind analizat in vederea avizarii sale de catre departamentele de resort din MEF.

- *Septembrie 2008*

Intalnire a reprezentantilor Ministerului Economiei si Finantelor, cu dl Andreas Tamberg, Global Fund Portfolio Manager si Fundatia RAA.

Asigurarea sustenabilitatii proiectelor

Rundei a 6-a

- I. Realizarea unei Strategii de Asigurarea Sustenabilitatii programelor FG Runda a 6-a:**

Constituirea unui Grup de Initiativa (GI) si organizarea a 3 intalniri de lucru ale GI (decembrie 2007, ianuarie si iunie 2008) pentru stabilirea obiectivelor strategice si a planului de interventie;
- II. Intalnire de lucru cu reprezentantii Ministerului Sanatatii Publice (MSP)-** Agentia Nationala de Programe, Autoritatea Nationala de Sanatate Publica, Directia Generala Strategii si Politici de Sanatate;
- III. Solicitare pentru audienta la Primarul General al Municipiului Bucuresti, Conf. dr. Sorin Oprescu;**
- IV. Participarea la intalnirile organizate de SR cu autoritatile locale din locatiile de implementare ale proiectelor;**
- V. Asistenta tehnica in stabilirea parteneriatelor cu autoritatile locale destinate asigurarii sustenabilitatii proiectelor Rundei a 6-a.**

Comunicare si promovare

- Website (www.fondulglobal.ro), cu toate sectiunile active: Fondul Global, recipient principal, stiri, povesti de succes, implementatori, stadiul implementarii, resurse, parteneri, etc;
- Newsletter (numerele 1+2) distribuit pentru 253 utilizatori;
- Aparitii si informatii in mass media (presa, radio, tv);

PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE
CONSULTATI

www.fondulglobal.ro

Romanian
Angel Appeal
