

Raport privind progresul implementarii granturilor GFATM - R6

Intrunirea CNC-FG din
20 Ianuarie 2009



GRANTUL HIV/SIDA RAPORT PROGRAMATIC

Progresul programului HIV/SIDA Rd 6 la finalul primului an de implementare (sumar)

- Din cei 14 indicatori cheie: 7 au fost depasiti (>100%), 1 realizat in proportie de 65%, 2 in proportie de 55%, iar alti 4 au inregistrat valori sub 30%
- **Raportul anual** a fost transmis FG la timp si a fost apreciat ca fiind un model foarte bun de raport
- Rating-ul programului la finalul primului an: **B1 (adecvat)**
- Pentru detalii despre progresul la sfarsitul primului an de implementare, consultati <http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/hiv-sida/>
- Datele de monitorizare se agregă semestrial, urmatorul raport va fi disponibil pe 15 Februarie 2009

Progresul programului HIV/SIDA Rd 6 – trimestrele 5 & 6 (iulie – dec 2008)

- Au fost inregistrate **recuperari semnificative** ale activitatilor in proiectele de prevenire HIV/SIDA adresate detinutilor si CDI & SWs aflatii temporar in aresturile politiei
- Au fost efectuate schimbari metodologice la nivelul unor proiecte
- Acordul de sub-grant cu Fundatia “I Nostri Bambini” a fost reziliat din motive de neperformanta
- Anchetele de supraveghere comportamentala in randul YPLWHAs, SWs & prizonieri au fost in perioada de pregatire
- Echipa de M&E a efectuat vizite de monitorizare la **11 implementatori** si a participat la majoritatea evenimentelor organizate de SRs in cadrul programului

Initiativa 38 (prevenirea HIV/SIDA in penitenciare)

- Pentru recuperarea indicatorilor in Q6, RHRN & organizatiile partenere (ALIAT, ARAS, ADV, INTEGRATION) au elaborat **planuri de implementare accelerata**, cu tinte saptamanale, stabilite de comun acord cu PR.
- Implementarea planurilor accelerate a fost monitorizata de RHRN, iar rezultatele comunicate periodic PR.
- In timpul vizitei din noiembrie 2008, dna Maria Kirova a apreciat mobilizarea rapida SRs si a PR in vederea recuperarii indicatorilor & coordonarea care functioneaza intre RHRN si organizatiile partenere

Initiativa 38 (cont)

La finalul lui Q6 (rezultate preliminare):

Număr de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, care au fost instruite să ofere informații despre prevenirea HIV/SIDA prin educație între egali (peer education) sau activități de teren în comunitate		
SR	Tinta Q6	Rezultate Q6 (peer educators)
ADV	100	508
ARAS	274	337
INTEGRATION	84	99
ALIAT	305	40
TOTAL	763	984

Număr de deținuți care au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA			
SR	Tinta Q6	Rezultate Q6 (sesiuni IEC)	Rezultate Q6 (peer educators)
ADV	2,353	1,841	508
ARAS	4,921	2,459	337
INTEGRATION	2,500	1,900	99
ALIAT	696	200	40
TOTAL	10,470	6,400	984

Dificultati in atingerea indicatorilor

SRs spun:

- Detinutii nu sunt interesati sa participe la activitatile IEC;
- Detinutii implicati deja in alte activitati, nu sunt interesati sa participe si la sesiunile IEC
- Personalul din penitenciare fac prea putine eforturi de a mobiliza detinutii sa participe la activitati IEC
- Realitatea din teren face ca planificarea sesiunilor IEC sa nu poata fi respectata intocmai (planificare orara, referitoare la numarul de sesiuni, numarul de participanti)

Consiliere si testare HIV voluntara in penitenciare

- Agentia Nationala AntiDrog (ANA) a finalizat instruirea echipelor locale mixte (1 specialist CPECA consiliere + 1 specialist ANP testare), a distribuit catre penitenciare testele HIV
- Au fost elaborate planuri de implementare accelerate, pentru recuperarea indicatorilor in Q6

Număr de utilizatori de droguri injectabile (IDU), persoane care practica sexul comercial (SW), persoane de etnie rroma si **detinuti care au beneficiat de consiliere pre-testare, au facut testul HIV si au primit rezultatul testului**

Implementator	Tinta Q6	Rezultate Q6
ANA	4,070	927

Dificultati in atingerea indicatorilor

- Echipete mixte nu sunt functionale in toate penitenciarele din urmatoarele motive:
 - ✓ medicii instruiti au delegat sarcinile de recoltare & testare asistentilor medicali
 - ✓ asistentii medicali nu sunt interesati sa se implice in proiect
 - ✓ Unii dintre specialistii instruiti sunt in concedii de lunga durata
 - ✓ Specialistul CPECA & specialistul ANP nu comunica & nu colaboreaza
- ANP este de parere ca protocolul de consiliere si testare VCT in penitenciare a fost realizat de ANA fara consultarea lor
- Este nevoie de promovare continua a serviciului VCT, pentru a recupera indicatorii restanti (tinand cont de faptul ca testarea este voluntara)

Prevenire HIV/SIDA in aresturile politiei pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile

- Interventii de prevenire HIV/SIDA (distribuire materiale IEC, referire catre alte servicii) a fost disponibila in 23 de aresturi
- Interventiile au fost livrate de personal special instruit (TNT & MIRA)
- Nu au fost distribuite prezervative
- MIRA a finalizat achizitia de truse & consumabile medicale pentru cabinetele medicale din cele 23 de aresturi
- Materialelor IEC au fost finalizate de TNT in Q5, iar distributia a fost facuta incepand din Q6
- **518 CDI** (doar ultimii 104 au primit materiale IEC) & **8 SWs** (doar ultimele 3 au primit materiale IEC); tinta pentru finalul lui Q6 era **250 CDI & 300 SWs** care sa fi primit pachetul de servicii definit in contract

Integrarea socio-profesionala a YPLWHAs

- **Fundatia “I Nostri Bambini” (Bals, jud. Olt)** – PR a reziliat acordul de sub-finantare ca urmare rezultatelor programatice foarte slabe & a intarzierilor repetate in implementare si raportare. O parte din fondurile recuperate au fost directionate catre alte proiecte din Rd 6 destinate YPLWHAs:
 - 1) **FDP:** Sera (atelier protejat) si-a incetat functionarea incepand cu Q6 (beneficiarii nu mai au timp & interes sa participe la proiect). Fondurile ramase vor fi utilizate pentru efectuarea unui exercitiu de identificare a ariilor de interes pentru economie sociala & pentru elaborarea unui ghid pentru ONG-uri in vederea initierii activitatilor de economie sociala

Integrarea socio-profesionala a YPLWHAs (cont.)


2) UNOPA – in proiectul “Educatia si Formarea Profesionala a Tinerilor Seropozitivi”, organizatia a primit un numar mare de aplicatii din partea YPLWHAs care solicitau burse pentru continuarea studiilor. Intrucat selectia bursierilor s-a facut la nivel national, PR a dat curs solicitarii UNOPA a suplimentat bugetul alocat pentru burse, numarul tinerilor care primesc burse de studiu crescand astfel de la 15 (cat era planificat initial) la 24.

Anchete comportamentale si serologice in randul grupurilor vulnerabile

- Ancheta de supraveghere comportamentala in randul **YPLWHAs** – colectarea datelor va incepe in luna februarie in cele 9 Centre Regionale HIV/SIDA; urmeaza selectia & instruirea operatorilor de teren.
- Ancheta de supraveghere comportamentala in randul **SWs din 9 judete** – date preliminare vor fi disponibile la 15 Februarie 2009
- Ancheta de supraveghere comportamentala & serologica in randul **SWs din Bucuresti & Ilfov** – colectarea datelor planificata pentru perioada Aprilie-Mai 2009; echipa de cercetare partial constituita, protocol de ancheta & instrumente in draft.
- Ancheta de supraveghere comportamentala & serologica in randul **detinutilor** – colectarea datelor planificata pentru Aprilie – Mai 2009. Echipa de cercetare constituita.

GRANTUL HIV/SIDA
RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

Raport anual privind fondurile primite vs. fonduri distribuite catre SR

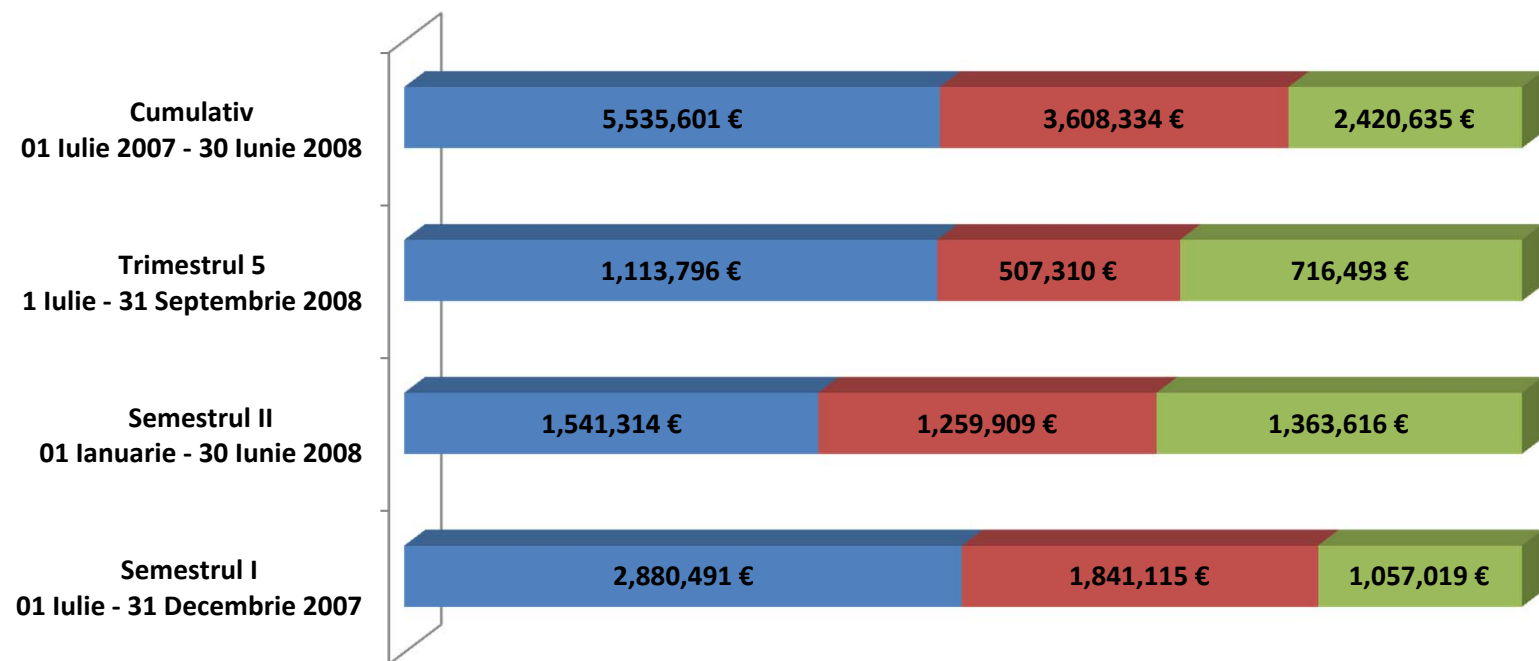

	Semestrul I 01 Iulie - 31 Decembrie 2007	Semestrul II 01 Ianuarie - 30 Iunie 2008	Trimestrul 5 1 Iulie - 31 Septembrie 2008	Cumulativ 01 Iulie 2007 - 30 Iunie 2008
■ Fonduri primite	2,880,491 €	1,541,314 €	1,113,796 €	5,535,601 €
■ Fonduri distribuite catre SR	1,841,115 €	1,259,909 €	507,310 €	3,608,334 €
■ Fonduri cheltuite de SR	1,057,019 €	1,363,616 €	716,493 €	2,420,635 €

Rata distribuirii si a cheltuirii fondurilor

- Pana in trimestrul 5, fata de bugetul contractat cu GFATM (4.479.195 Euro), PR a distribuit **80%** din fonduri
- SR au cheltuit **54%** din bugetul agreeat cu GFATM

Achizitii PR

- Au fost achizitionate si distribuite SR-lor:
 - 1.297.296 buc. prezervative;
 - 944.999 buc. seringi;
 - 95.500 buc. lubrifianti
- Urmeaza a fi lansate cererile de oferta pentru contractarea auditului extern aferent anului 2008.
 - Termen de finalizare a contractului – 20 Februarie
 - perioada de auditare 1 Martie -15 Mai ;
 - 15 Iunie termenul limita de finalizare a raportului de audit

GRANTUL TUBERCULOZA

RAPORT PROGRAMATIC

Grantul TB – Progres General

Indicatori (al doilea Semestru):

Din cei 17 indicatori- cheie, pentru 13 era prevazuta raportare la sfarsitul Semestrului II.

- 4 indicatori- cheie au fost depasiti (>100%);
- 3 tinte au fost atinse semnificativ (81-99%)
- 2 indicatori partial realizati (50-80%)
- 1 indicator sub-realizat (<50%)
- 1 indicator cu nivel 0, Ancheta Nationala de Supraveghere a chimiorezistentei tuberculozei

<http://www.fondulglobal.ro/stadiul-implementarii/tb/>

Rating-ul acordat Grantului TB pentru al doilea semestru de implementare: A2 (indeplineste asteptarile).

Grant Rating Tool for Grant:ROM-607-G04-T

Rated Period : 2 Period Start: 01.Apr.2008
 Latest Reporting Due Period : 1 Period Start: 01.Oct.2007

Period End: 30.Sep.2008
 Period End: 31.Mar.2008

Active Indicators Used in Rating Calculation

Top 10	Train.	#	Active Indicator Name	Target		Result		Percentage
				Period	Value	Period	Value	
Yes	No	1.1	Number of new smear-positive cases detected under DOTS among the general population	2	10,000	2	9,610	96%
Yes	No	1.2	Number of new smear-positive TB cases registered under DOTS who are successfully treated	2	7,790	2	7,103	91%
No	No	2.1	Number of homeless TB suspects identified and referred to medical services	2	160	2	180	112%
Yes	No	2.2	Number of smear-positive TB cases detected among homeless	2	50	2	33	66%
Yes	Yes	2.3	Number of people trained to provide TB education, referral and DOTS to homeless	2	135	2	165	122%
Yes	No	2.5	Number of people from vulnerable communities reached with TB health education through community based activities	2	4,700	2	7,537	150% *
Yes	Yes	2.6	Number of penitentiary staff trained in TB prevention, education, and control activities	2	360	2	136	38%
Yes	No	2.7	Number of prisoners reached with TB health education sessions	2	5,280	2	3,855	73%
Yes	Yes	4.1	Number of NTP staff trained in program management, surveillance, epidemiology and financial management	2	150	2	124	83%

* Individual indicators should have a maximum score of 150%, when calculating the mean.

 Value for Reporting Period missing. The nearest preceding value is taken if available

Performance Rating	All Indicator or Top Indicator Score
A1	>100
A2	90%-100%
B1	60% - 89%
B2	30% - 59%
C	< 30 %

AVG performance on TOP TEN indicators	93%
TOP TEN indicators rating	A2
AVG performance ALL indicators	92%
ALL indicators rating	A2
Quantitative Indicator rating	A2

Cannot Calculate Scenarios	
S1	Target and Result are in different value types
S2	Target and Result are entered as Text. % Achievement is missing.
S3	Target is zero
S4	Result is zero for indicator requiring reverse calculation.
S5	Numerator/Denominator/% value incomplete

Grantul TB – Progres General

Al treilea Semestru (perioada Octombrie – Decembrie '08)

- 441 Medici de Familie instruiti (fata de 1.000 planificati pana la finalul fazei I a Grantului)
- 801 copii si tineri fara adapost atinsi cu interventii IEC (fata de 1.000 planificati pana la finalul fazei I)
- 10.243 persoane din grupuri vulnerabile atinse cu activitati IEC (fata de 8.600 planificate pana la finalul fazei I)
- 52 jurnalisti instruiti fata de 80 planificati pana la finalul fazei I
- Al treilea newsletter electronic a fost trimis catre cel putin 150 de persoane in data de 11.12.2008
- 176 specialisti din retea de pneumoftiziologie instruiti, fata de 300 planificati pana la finalul fazei I, in sistem rezidential

Grantul TB – Progres General

Al treilea Semestru (perioada Octombrie – Decembrie '08)

- 240 suspecti TB identificati in randul copiilor/tinerilor fara adapost (fata de 360 planificati pana la sfarsitul fazei I de implementare a Grantului), din care 76 au fost diagnosticati cu TB (39 cu TB pulmonara cu microscopie pozitiva si 1 caz de meningita TBC)
- Toti suspectii au fost trimisi catre servicii medicale si au beneficiat de suport social si material
- A fost lansata cererea de scrisori de intentie pentru proiecte de cercetare operationala in domeniul controlului TB: au fost primite 18 propuneri de cercetare
- Au fost intruite aproximativ 35 persoane in metodologia cercetarii, abilitati pentru sciirea unor propuneri de finantare, etc., fata de 30 planificate.

Grantul TB – Progres General

Al treilea Semestru (perioada Octombrie – Decembrie '08)

- Ghidul de implementare al strategiei PAL a fost finalizat; Misiunea tehnica din partea OMS pentru aceasta arie de interventie a propus replanificarea activitatilor, respectiv rafinarea continutului ghidului de implementare al PAL
- 88 medici de familie din Calarasi si Dolj au fost instruiti pentru realizarea unui studiu de referinta referitor la managementul pacientilor cu simptome respiratorii la nivelul asistentei medicale primare
- Au fost achizitionate echipamente medicale pentru asistenta medicala a bolnavilor cu afectiuni respiratorii: pulsoximetre, nebulizatoare, peak-flow-metre, spacer.
- 50 persoane, reprezentanti ai organizatiilor si institutiilor implicate in activitati de control al TB au fost instruite referitor la ACSM in judetul-pilot Maramures
- A fost initiat un studiu de identificare a nevoilor bolnavilor cu TB (chestionar aplicat la 132 bolnavi de TB) util pentru elaborarea strategiei nationale de ACSM

Administratia Nationala a Penitenciarelor

2 ateliere comune referitor la
colaborarea retelei de
pneumoftiziologie cu sistemul
penitenciar, respectiv revizuirea
Programului National de Control
al TB in sistemul penitenciar:
Amara 20-25 octombrie, 64
participanti



Administratia Nationala a Penitenciarelor



28 vizite de supervizare pentru monitorizarea implementarii PNCT in sistemul penitenciar, ocazie cu care au fost instruite un numar de 321 persoane in masuri de control al infectiilor cu transmitere pe cale aeriana



Aproximativ 5,580 detinuti care au participat la sesiuni de IEC in sistemul penitenciar, fata de 10,560 prevazuti pana la sfarsitul Semestrului III

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania



- revizuirea metodologiei de distribuire a stimulentei
- instruirea voluntarilor si a personalului implicat din rețeaua TBC



- organizarea activitatii de distribuire a stimulentei: conferinte de presa, afise, etc.
- prima distributie in luna decembrie: 547 bolnavi TB din cele 2 judete au primit stimulente

Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”

- Aprobarea GLC pentru includerea in proiectul DOTS-Plus a 320 bolnavi cu MDR-TB a fost primita in data de **24 octombrie 2008**
- Cererea de achizitie a medicamentelor de linia a 2-a pentru cei 320 bolnavi a fost trimisa catre GDF in data de **4 noiembrie**, iar acesta a notificat IDA in mod oficial pentru cantitatile prevazute de medicamente
- Autorizatia de introducere in tara a medicamentelor de linia a2-a procurate de la IDA, in special cele neinregistrate pe piata din Romania a fost obtinuta in data de **7 noiembrie 2008**.
- Solicitarea necesarului de medicamente de linia a 2-a pentru primul transport, calculat impreuna cu reprezentantii Institutului, a fost trimisa catre IDA in data de 14 noiembrie 2008, iar cotati a a fost primita in data de **28 noiembrie 2008**
- Plata in avans medicamentelor s-a efectuat in data de 11 decembrie 2008
- Contractul tripartit Inst. Nasta – RAA – UNIFARM pentru stocarea si distribuirea medicamentelor de la IDA, inclusiv cele procurate in cadrul Rundei a 2-a a fost incheiat in data de **31 octombrie 2008**

Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”

- Ancheta de Supraveghere a Chimiorezistentei Tuberculozei la substantele antituberculoase de linia a 2-a:
 - Corespondenta intensa intre partenerii implicati: UIP-TB, RAA, OMS si Fondul Global referitor la design-ul studiului (prospectiv vs. retrospectiv)
 - RAA a propus un draft de protocol, pentru realizarea unui studiu de tip prospectiv, in data de 29 octombrie 2008 in vederea discutarii acestuia impreuna cu expertii OMS
 - Intalnirea reprezentantilor partenerilor implicati la Poiana Brasov, cu ocazia Conferintei de inchidere a Grantului TB din Runda a 2-a.
 - Misiunea OMS nu s-a mai derulat in luna Decembrie 2008 datorita progamului supraincarcat al managerului PNCT si a constrangerilor de buget ale PNCT

Monitorizare

- 7 vizite de monitorizare efectuate:
 - ANP – monitorizarea vizitelor de supervizare a aplicarii programelor & sesiunile de instruire a detinutilor & atelier lucru comun reprez. retelei PNCT si ai retelei penitenciarelor
 - CPSS – caravanele cu sesiunile IEC in populatii vulnerabile
 - CPSS & CNSMF – instruirea medicilor de familie pentru realizarea unui studiu de referinta pentru managementul pacientilor cu simptome respiratorii, la nivelul asistentei medicale primare.

Dificultati

- Intarzierea finalizarii si publicarii in Monitorul Oficial a Normelor de Implementare ale PNCT; acesta a fost unul din motivele care a dus la intarzierea intocmirii si trimiterii aplicatiei la GLC
- De subliniat intarzierea extrem de mare (3 trimestre) cu care s-a reusit incheierea acordului de sub-finantare cu ANP, la care se adauga intarzierea mare cu care ANP a desemnat o persoana cu competenta in IT care sa fie implicata in activitatile specifice ale UIP-TB
- Intarzierea creditarii platformei de e-learning pentru personalul din retea de pneumoftiziologie de catre Colegiul Medicilor ceea ce a dus la intarzierea demararii sesiunilor de invatamant la distanta pentru aceasta categorie

Grantul TB – Runda a 6-a

Raport de Progres si Rating

- Al Doilea Raport de Progres si Cererea de Finantare, precum si Raportul consolidat anual au fost transmise catre LFA si FG cu respectarea termenului-limita
 - Raportul este disponibil pe www.fondulglobal.ro
- Ratingul obtinut pentru Semestrul II de implementare este A2 = Indeplineste asteptarile
 - Raportul este disponibil pe www.theglobalfund.org

Grantul TB – Runda a 6-a

Concluzii:

- Au fost incheiate acorduri de sub-finantare pentru toate ariile de interventie
- In ciuda dificultatilor intampinate, rapoartele de monitorizare si evaluare indica faptul ca implementarea este pe o directie buna si ca sunt sanse foarte mari ca intarzierile in realizarea indicatorilor-cheie sa fie recuperate pana la sfarsitul Semestrului III.

Indicatori/activitati care nu vor putea fi realizati:

- Nr. de detinuti participanti la sesiuni de IEC din sistemul penitenciar: va fi doar partial realizat.

Top Sub-recipienti

(care merita felicitările noastre speciale)



Pentru indeplinirea simultana a 5 criterii:

- corectitudine financiara
- profesionalism in implementare
- calitatea raportarilor
- respectarea termenelor
- raspunsul rapid la solicitari

CRR

Salvati Copiii

CPSS

Alte activitati conexe Grantului TB realizate de PR in perioada Sept. – Dec. 2008

- Revizuirea normelor de implementare ale PNCT, in vederea includerii unor recomandari ale Misiunii GLC
- Demersuri pentru achzitionarea medicamentelor antituberculoase de linia a 2-a de la GLC/ IDA pentru TOTI bolnavii de MDR- TB din tara
- Demersuri pentru includerea Streptomicinei si Kanamicnei pe lista medicamentelor prevazute a fi decontate in cadrul Programelor Nationale de Sanatate in anul 2008


Achizitii realizate

- Achizitii PR
 - Medicamentele antituberculoase de linia a 2-a pentru bolnavii cu MDR-TB de la GLC-IDA
 - Servicii de vamuire-depozitare-distributie a medicamentelor de linia a 2-a de la S.C. UNIFARM S.A.
 - Echipamente medicale pentru medicii de familie care vor implementa strategia PAL in regim pilot.
- Achizitii SR
 - CPSS, Salvati Copiii si SNSPMS – achizitiile sunt realizate conform planificarii.
 - ANP – achizitiile sunt intarziate fata de planificare si trebuie depuse eforturi sustinute pentru recuperarea intarzierilor.

GRANTUL TUBERCULOZA

RAPORT FINANCIAR & ACHIZITII

Raport privind fondurile primite vs. fonduri distribuite catre SR pentru primul an de implementare (01 Octombrie 2007 – 31 Septembrie 2008)

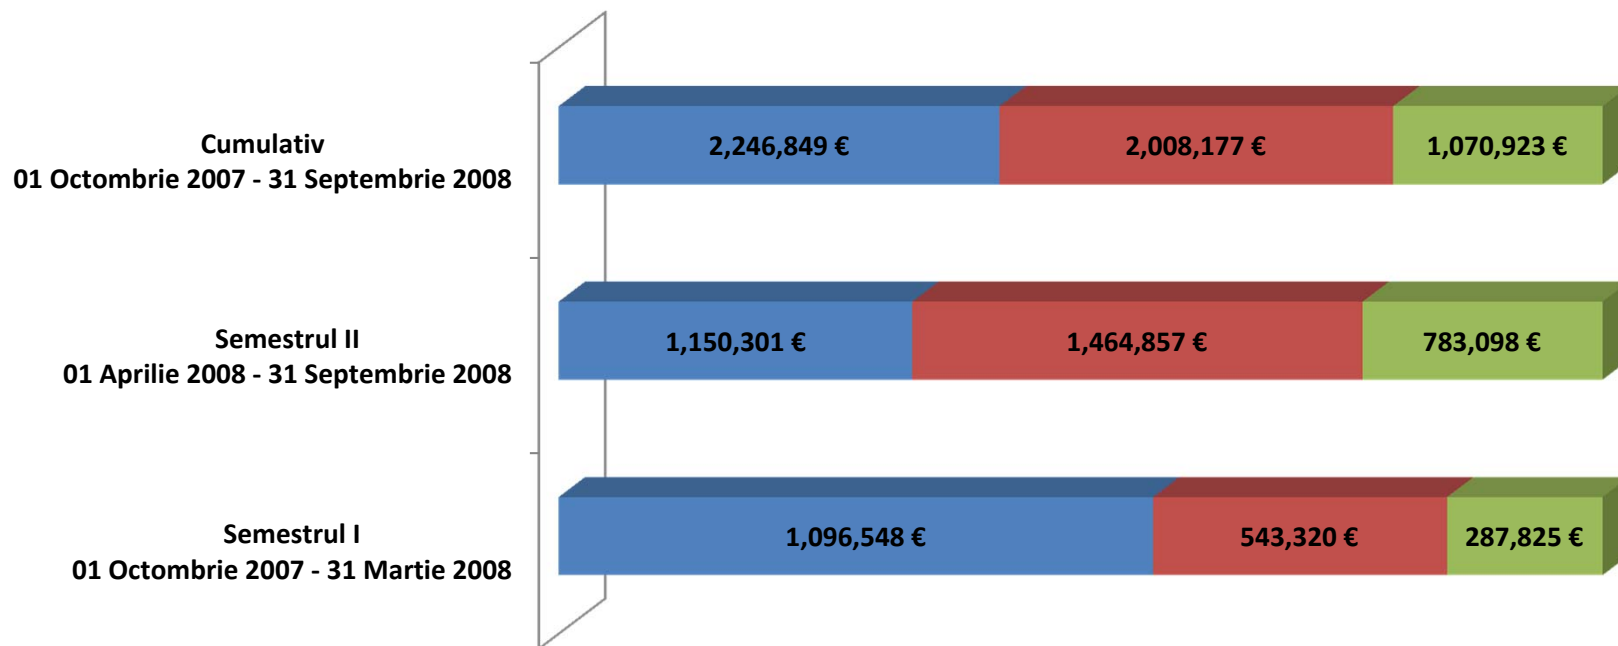

	Semestrul I 01 Octombrie 2007 - 31 Martie 2008	Semestrul II 01 Aprilie 2008 - 31 Septembrie 2008	Cumulativ 01 Octombrie 2007 - 31 Septembrie 2008
■ Fonduri primite	1,096,548 €	1,150,301 €	2,246,849 €
■ Fonduri distribuite catre SR	543,320 €	1,464,857 €	2,008,177 €
■ Fonduri cheltuite de SR	287,825 €	783,098 €	1,070,923 €

Rata distribuirii si a cheltuirii fondurilor

- In primul an de implementare, fata de fondurile primite de la GFATM (2.246.849 Euro), PR-ul a distribuit SR-lor **89%** din acestea.
- SR au cheltuit **53%** din fondurile distribuite de PR, reprezentand **56%** din bugetul contractat cu GFATM

Achizitii realizate

- A fost finalizata achizitia de echipamente medicale (peakflowmetre, pulsoximetre, spacer si nebulizatoare) pentru Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei. Echipamentele sunt in curs de livrare
- A fost lansata si achitata comanda de medicamente MDR-TB de linia a 2-a
- Au fost negociate si contractate serviciile Unifarm SA de stocare si distributie medicamente MDR-TB linia 2
- In curs de lansare cererile de oferta pentru achizitia auditului extern (cu acelasi calendar ca si auditul grantului HIV/SIDA).

COMUNICARE
LOBBY SUSTENABILITATE

Activitati de lobby

In perioada **iunie-decembrie 2008** ofiterul de legatura RAA a initiat si participat la 6 intalniri de lucru cu:

- Agentia Nationala de Programe – MS
- Autoritatea Nationala de Sanatate Publica-MS
- Cabinetul Secretarului de Stat conf. Mircea Manuc-MS
- Cabinetul Primarului General al Municipiului Bucuresti
- Autoritatea de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

Tematica abordata

Tematica abordata in cursul intalnirilor a cuprins:

- Stadiul implementarii programelor finantate de Fondul Global, Runda a 6-a;
- Prezentarea pe scurt a institutiilor si organizatiilor cu expertiza in implementarea proiectelor destinate grupurilor vulnerabile;
- Rezultatele intermediare obtinute in implementarea granturilor;
- Dificultatile cu care implementatorii se confrunta in atingerea obiectivelor propuse;
- Evaluarea conditiilor de asigurarea sustenabilitatii programelor finantate de Fondul Global prin preluarea si finantarea lor din surse interne;
- Lobby pentru adoptarea cadrului legislativ de reglementare programatica in domeniul HIV/SIDA si TB.

Forumul Societatii Civile a Fondului Global

- Cea de a 3-a editie organizata la Dakar, Senegal;
- Participante din partea Romaniei: Catalina Iliuta, UNODC si Mihaela Stefanescu, RAA;
- Temele abordate in cursul conferintei au vizat:
 - Consolidarea rolului si locului pe care societatea civila il detine in implementarea si coordonarea programelor finantate de Fondul Global;
 - Prezentarea unor modele de bune practici in functionarea CCM si a Secretariatului CCM;
 - Asumarea de catre Secretariatul CCM a unui rol proactiv in imbunatatirea activitatii si reprezentarii CCM;
 - Perspectivile derularii Runderi a 8-a si estimativ, a 9-a de finantare (conditii de aplicabilitate si eligibilitate, termene de depunere a aplicatiilor, politici financiare, etc);
 - Programele finantate de Fondul Global in contextul crizei economice si financiare internationale;
 - Imbunatatirea componentei de comunicare si parteneriat dintre institutii guvernamentale, societatea civila si CCM.



Website-ul Fondul Global, Runda a 6-a (www.fondulglobal.ro)

- Actualizat periodic pentru sectiunile:
 - Activitati PR: rapoarte lunare, semestriale, anuale, de progres;
 - Licitatii si achizitii (call for tenders);
 - Stadiul implementarii;
 - Evenimente;
 - Noutati si stiri;
 - Album foto;
 - Resurse HIV/SIDA si TB;
 - Activitati ale sub-recipientilor;
 - Newsletter: primul numar difuzat in iulie 2008, cel de al doilea numar aflat in lucru (va fi lansat pana la 15 februarie 2009).

Initiative de asigurarea sustenabilitatii programelor

- Continuarea intalnirilor cu factorii de decizie din autoritatile guvernamentale abilitate
- Organizarea unei intalniri intre institutiile si organizatiile implementatoare si reprezentantii Camerei Deputatilor (CDEP) si ai Comisiei pentru Sanatate si Familie, Comisiei pentru Munca si Protectie Sociala si ai Comisiei pentru Egalitatea de Sanse din CDEP;

Intalnirea propusa cu reprez. CDEP

- Constituirea unui grup de initiativa al CCM, avand ca atributii definitivarea listei de participanti, agendei de lucru, detaliilor organizatorice, etc.
- Obiectivele principale al acestei intalniri:
 - asigurarea sustenabilitatii programelor finantate de Fondul Global
 - facilitarea dialogului direct dintre reprezentantii comunitatilor afectate, organizatii si institutii implementatoare si membrii CDEP

**ALTE ACTIVITATI DERULATE DE PR
LA SOLICITAREA GFATM / OMS**

Asistenta tehnica

Tuberculoza

- Septembrie 2008: Beneficiar PNCT Malawi, workshop M&E si dezvoltarea planului de M&E Runda a 7-a
- Noiembrie 2008: Beneficiar Belarus, revizuirea aplicatiei pentru Runda a 8-a
- Decembrie 2008: Beneficiar PNCT Albania, revizuirea Strategiei Nationale 2008 - 2013

HIV/SIDA

- Ianuarie 2009: Beneficiar JAZAS - PR-ul din Serbia – Runda a 8-a, Pregatirea implementarii grantului (inclusiv evaluarea LFA) si managementul SRs.
